

Module R3.10 : Management des Systèmes d'Information (MSI)


Enseignante : ISMAIL Olfa

2022/2023




Chapitre 1 : Gestion de projet

Les acteurs d'un projet

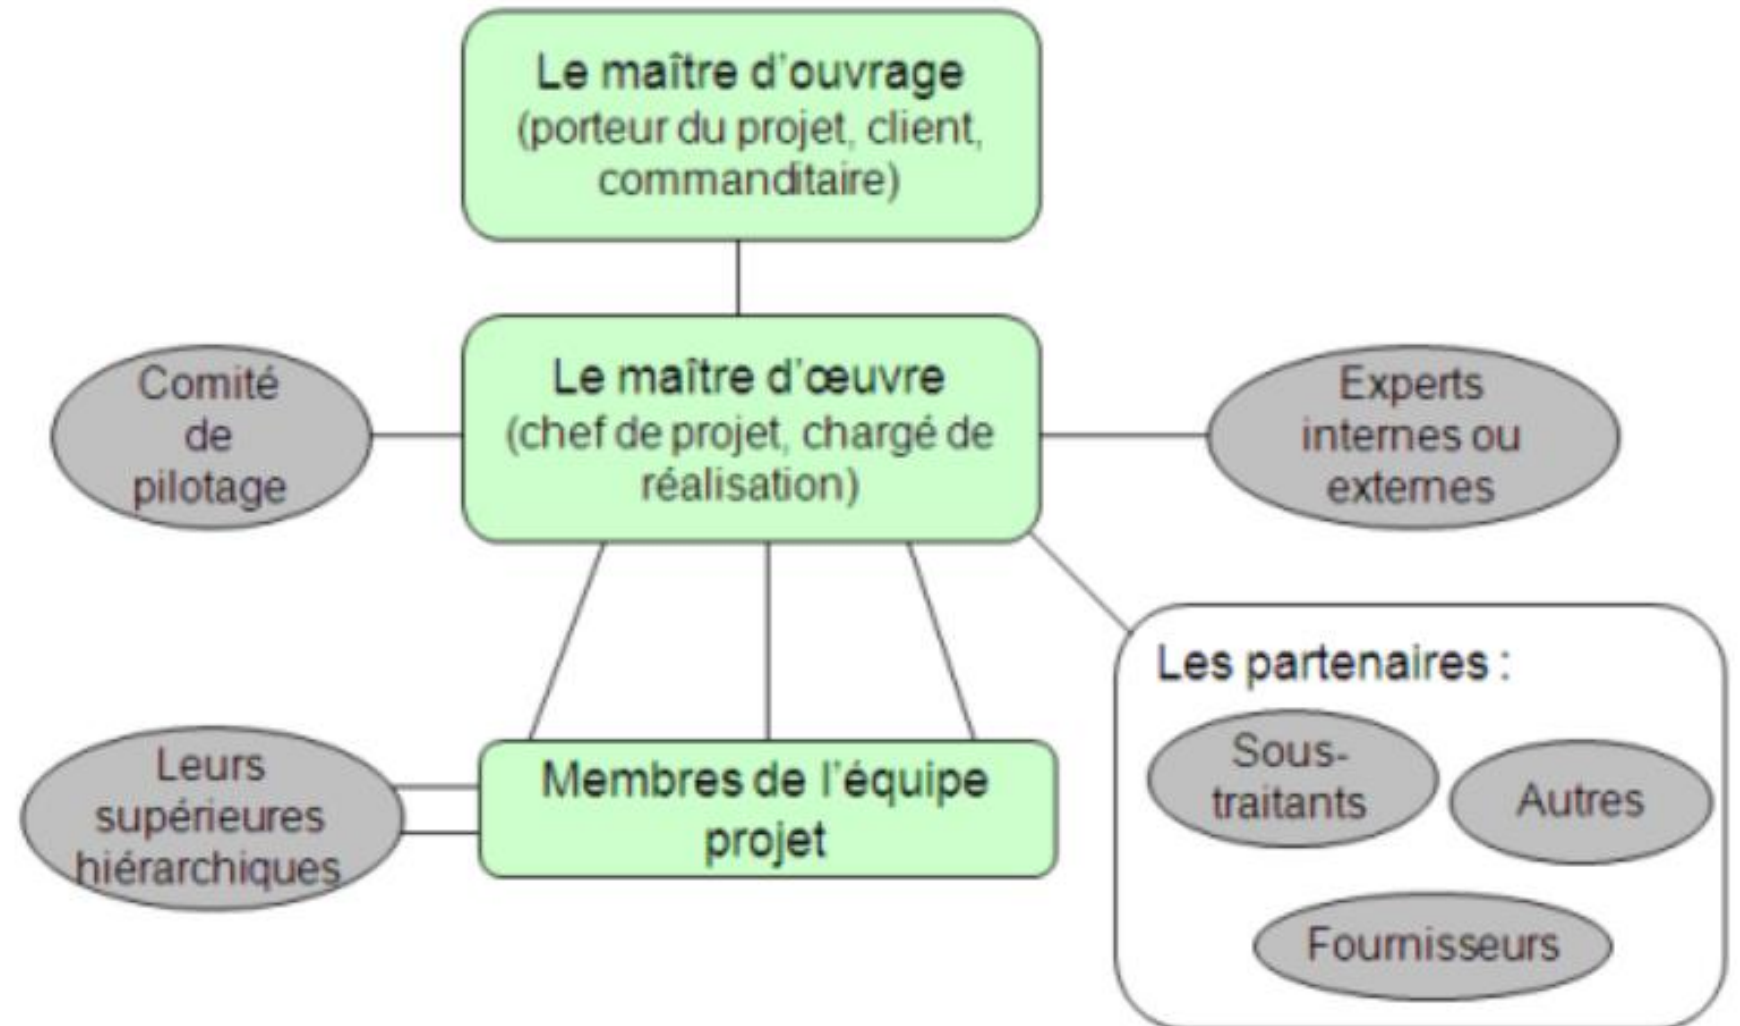


Les étapes de la gestion de projet

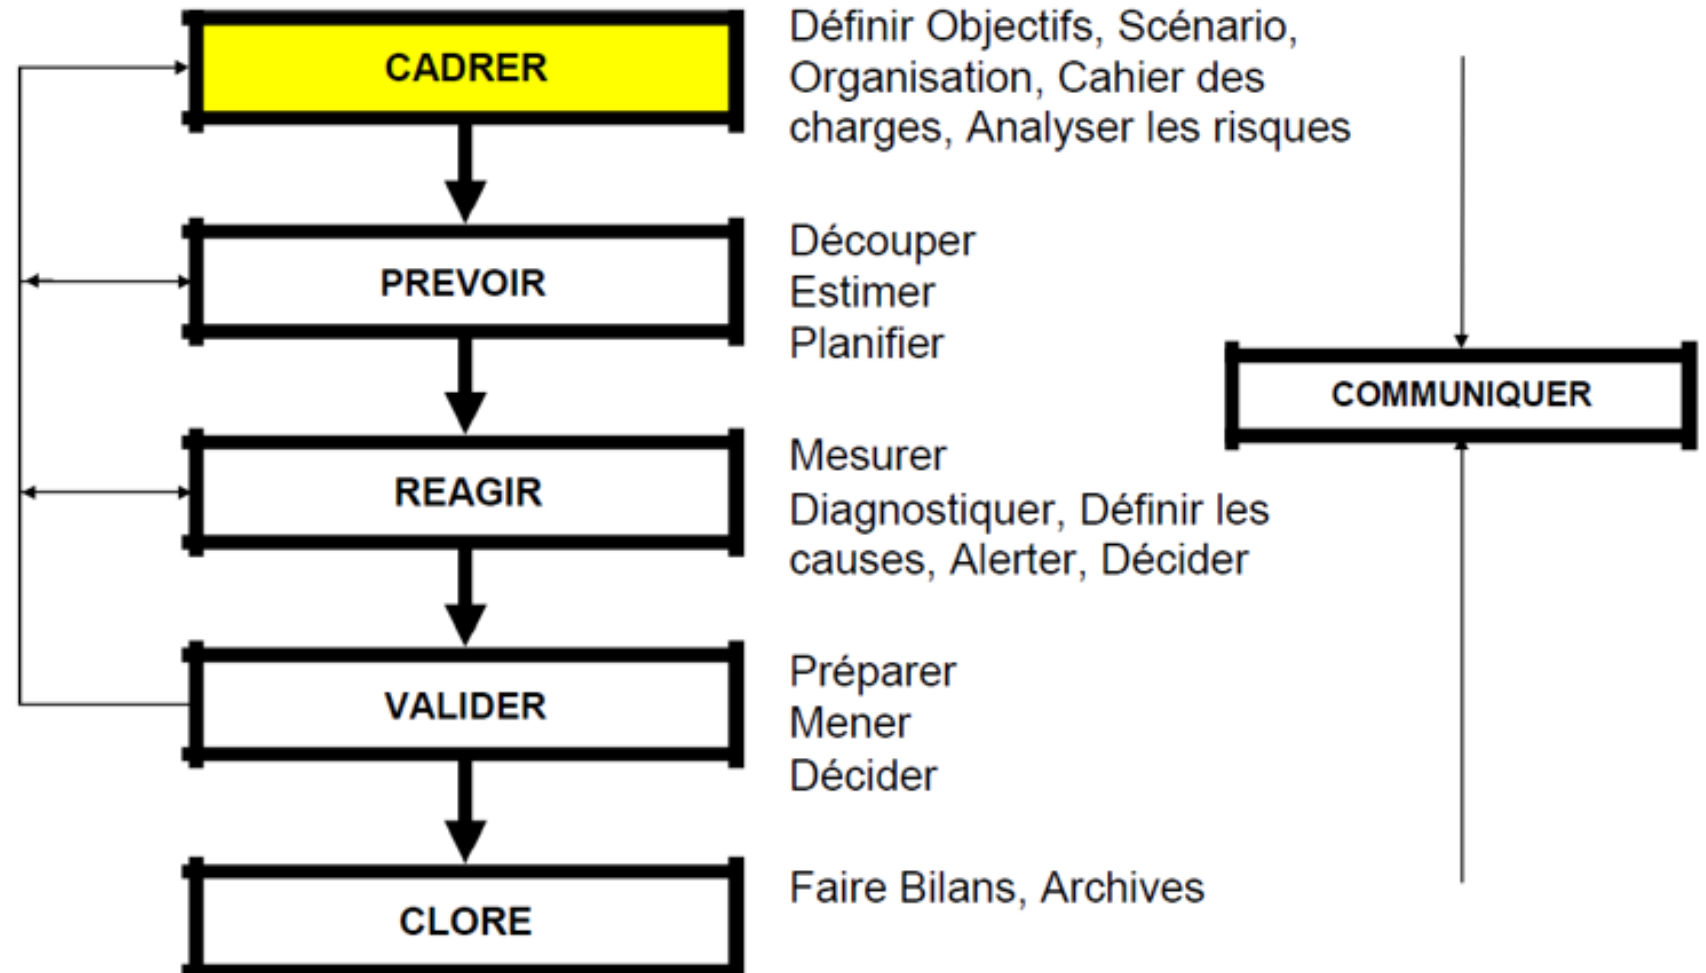

Étape 1 : Cadrage du projet

- ❖ La note de cadrage
- ❖ L'analyse systémique

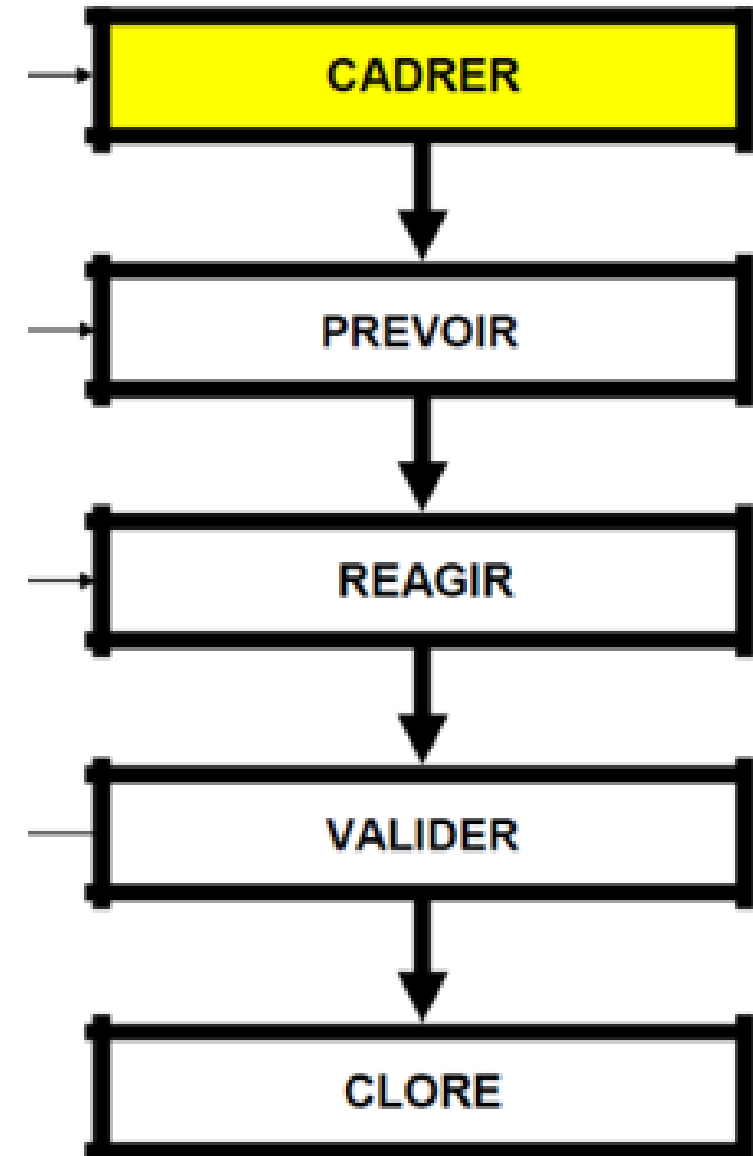

La note de cadrage

Il s'agit du document de référence dans le processus. Il reprend dans les grandes lignes les points importants à connaître d'un projet.

Il répond aux [questions QQQQCP](#) :

- **Q - Quoi** : définition du projet, périmètre
- **P - Pourquoi** : finalité du projet, contexte de la demande
- **Q - Qui** : parties impactées, parties prenantes, chef de projet, équipe projet, utilisateurs clés
- **O - Où** : lieu (à préciser si nécessaire)
- **Q - Quand** : planning, dates clés
- **C - Comment** : méthodes, ressources, budget...

Structure d'une note de cadrage

- 1 Définition du projet ?
- 2 Origine du projet / Contexte
- 3 Objectifs du projet
- 4 Périmètre du projet
- 5 Contraintes
- 6 Acteurs
- 7 Macro Planning
- 8 Ressources
- 9 Communication
- 10 Risques

1

Définition du projet

- *De quoi s'agit-il ?*
- *Que contient le projet ?*
- *Quelle est l'idée à développer ?*

2

Origine du projet / Contexte

- *Qu'est-ce qui justifie ce projet ?*
- *Pourquoi mener ce projet ? Pourquoi est-ce nécessaire ?*

3

Objectifs du projet

- *Quel est le but du projet ? Les finalités ?*
- *Quelles sont les attentes ?*
- *Quels sont les objectifs ?*

4

Périmètre du projet

- *Quelles sont les limites du projet ?*
- *Quels services/processus/ fonctions/zone géographique/ segment de client/ inclure ou exclure ?*

5

Contraintes

Des contraintes internes et externes peuvent s'imposer et doivent être prises en considération par le chef de projet. Il peut s'agir, de contraintes d'effectifs, de moyens, de timing, de résultat...

6

Acteurs

- *Qui sont les membres de l'équipe projet ?*
- *Qui est en charge de chaque domaine ?*
- *Quelles sont les autres parties prenantes ?*
- *Qui sont les experts ?*
- *Qui sont les utilisateurs clés ?*

7

Macro Planning

- *Quelles sont les étapes et dates clés ?*

8

Ressources

- **Les moyens humains** : ressources internes et externes nécessaires.
- **Les moyens matériels** : machines, outils, salles de réunion...
- **Les ressources financières** : précision de l'enveloppe budgétaire allouée à la réalisation du projet.

9

Communication


Définir dans les grandes lignes qui communique à quel moment, ainsi que les moyens utilisés.

10

Risques

- *Quels sont les risques ?*
- *Quelles sont les faiblesses ? Vulnérabilité ?*

L'analyse systémique

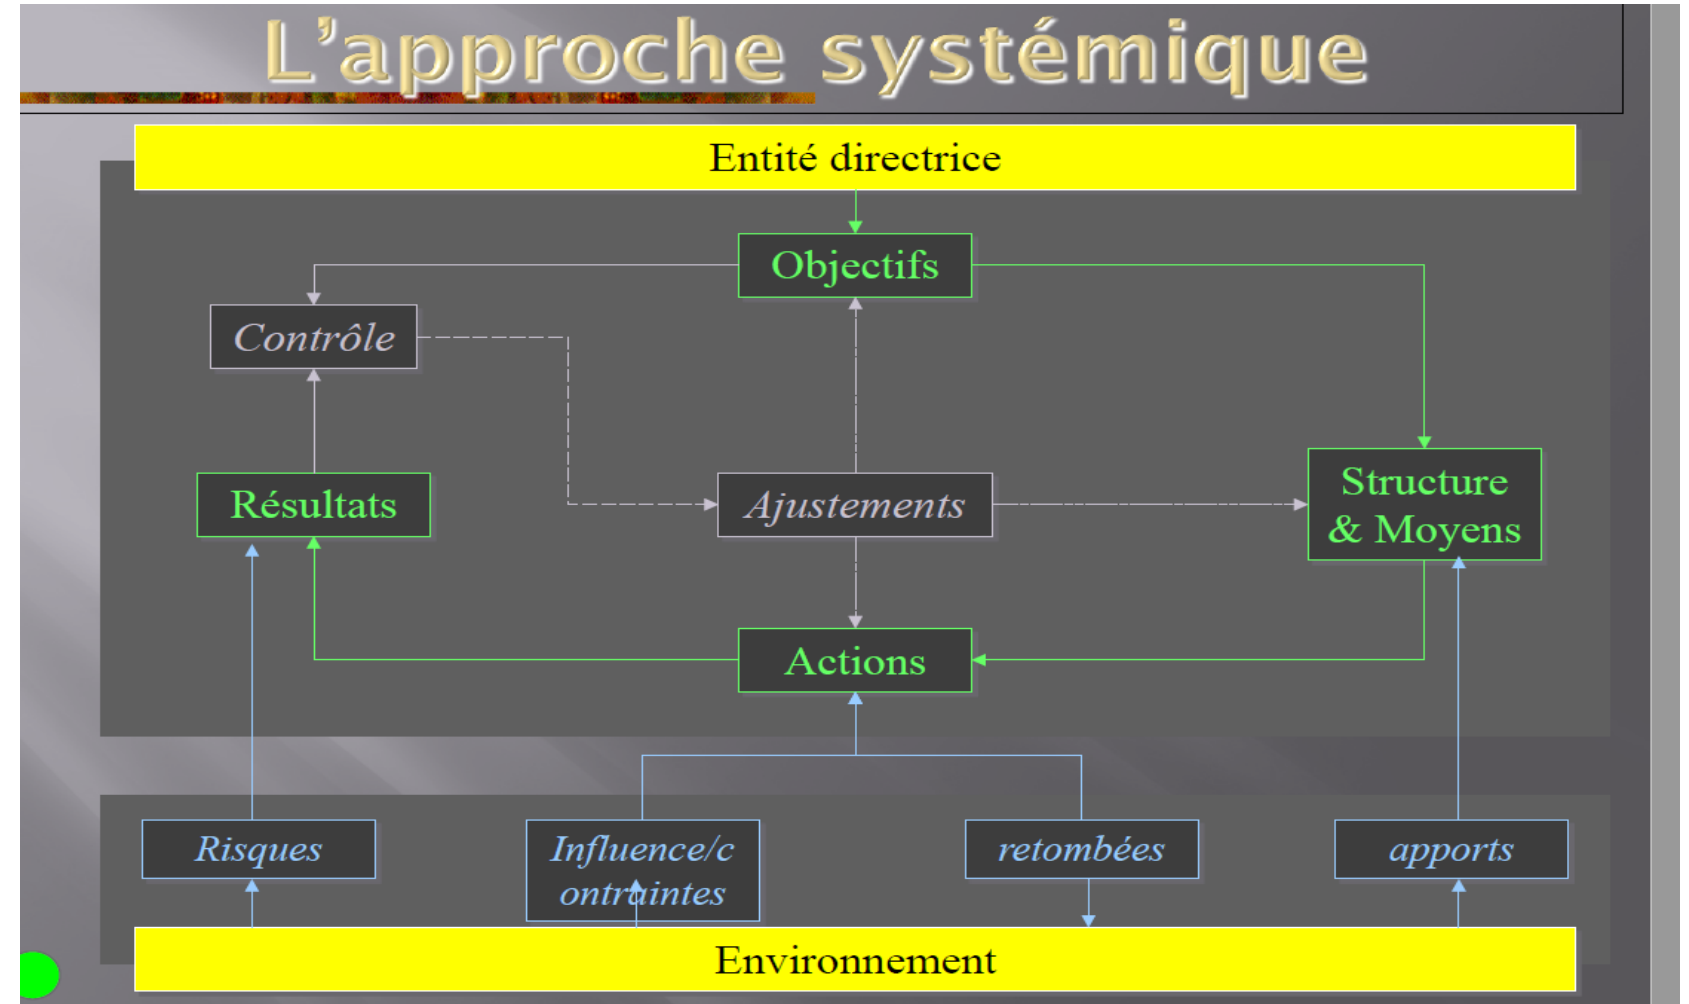



Étape 2 : Prévision

PERT : Program Evaluation and Review Technic


Gantt : Il doit son nom à Henry GANTT,

OTP : Organigramme technique du projet

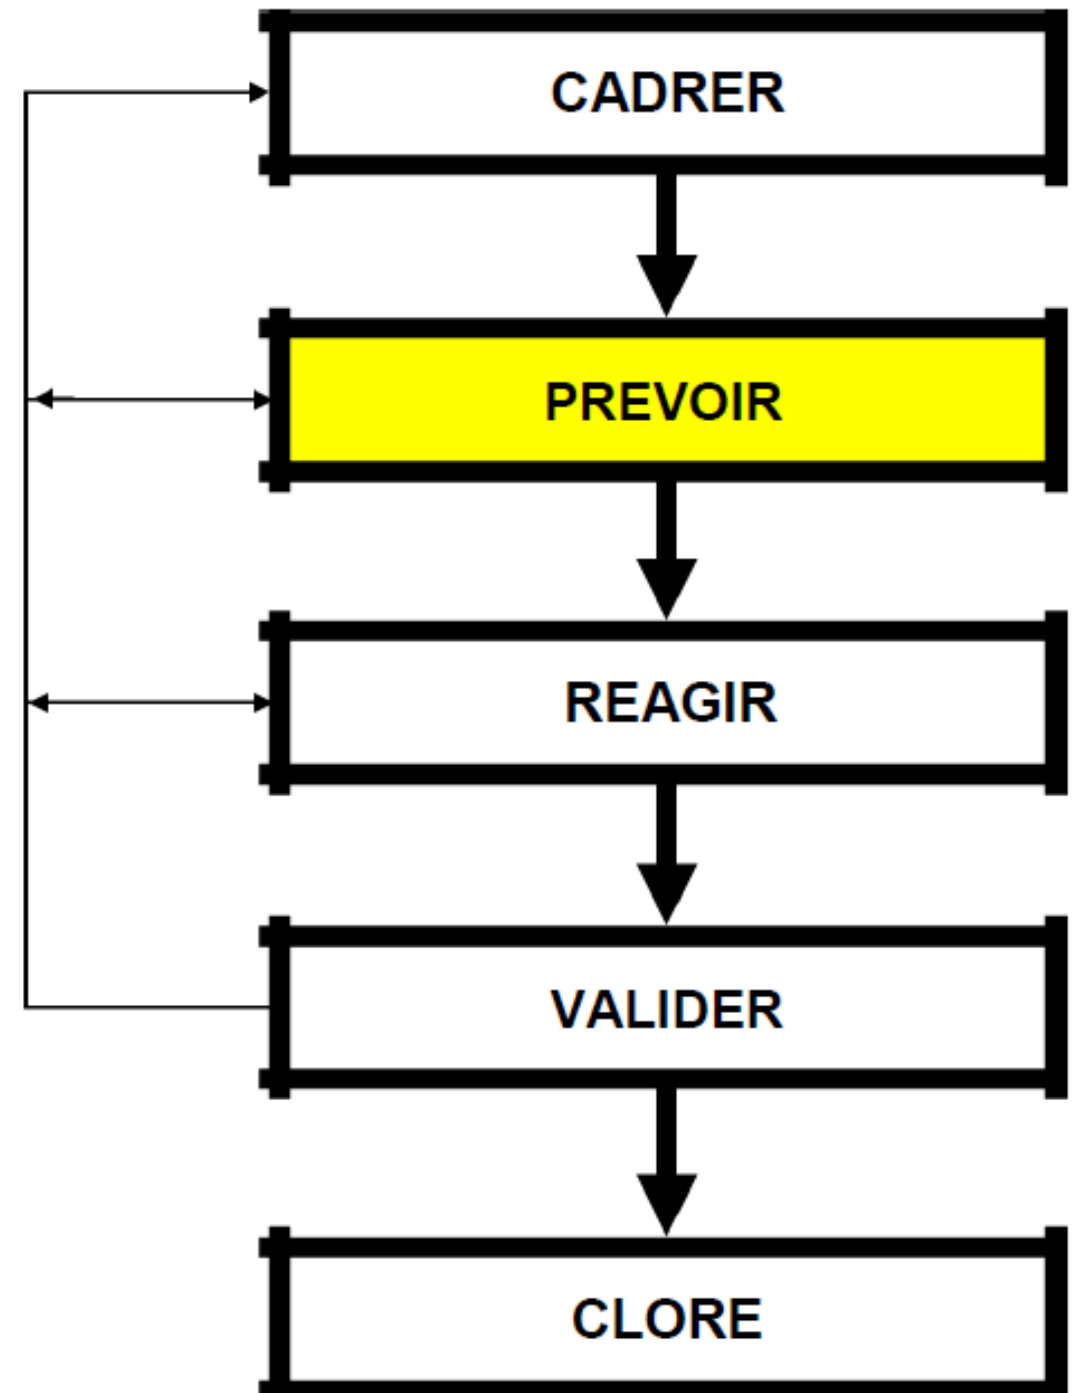

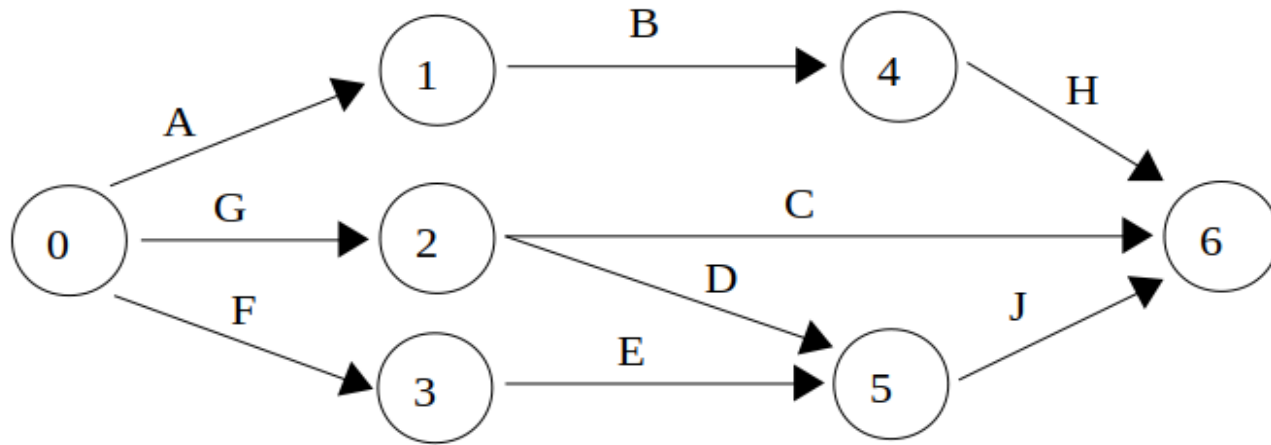


PERT: outil visuel d'ordonnancement et de planification de projet. Son but est d'organiser les tâches sous la forme d'un réseau afin de faciliter la gestion du projet.

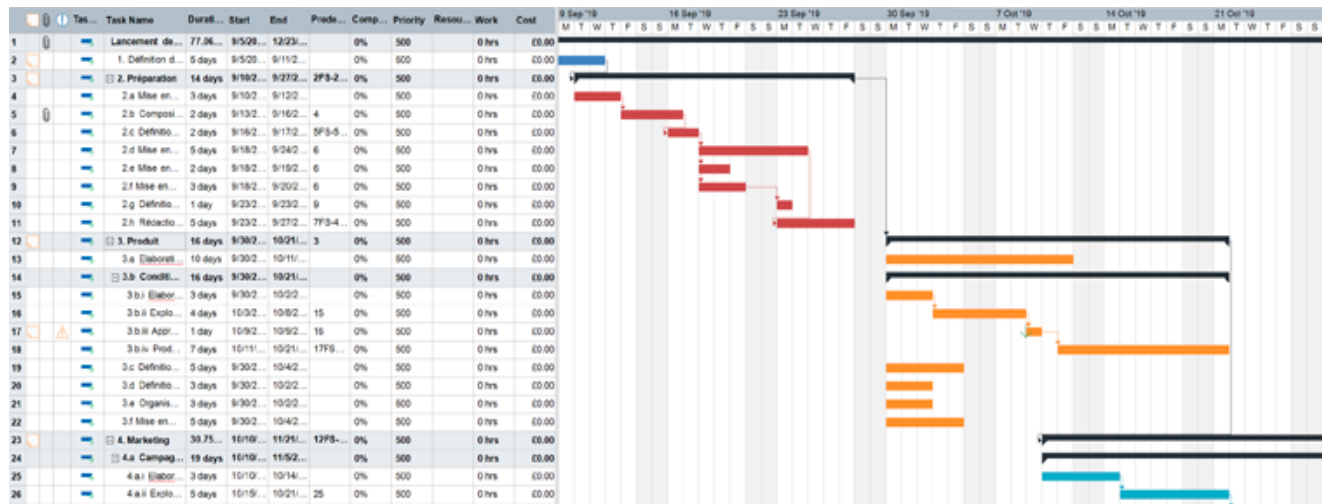

GANTT: L'outil fournit des informations visuelles sur le calendrier du projet, les délais et les responsabilités de chaque membre de l'équipe.

Organigramme technique du projet (OTP) Work Breakdown Structure (WBS)

Un **organigramme** des tâches du **projet** (OTP), ou encore work breakdown structure (WBS) (en anglais), est une décomposition hiérarchique des travaux nécessaires pour réaliser un **projet**.

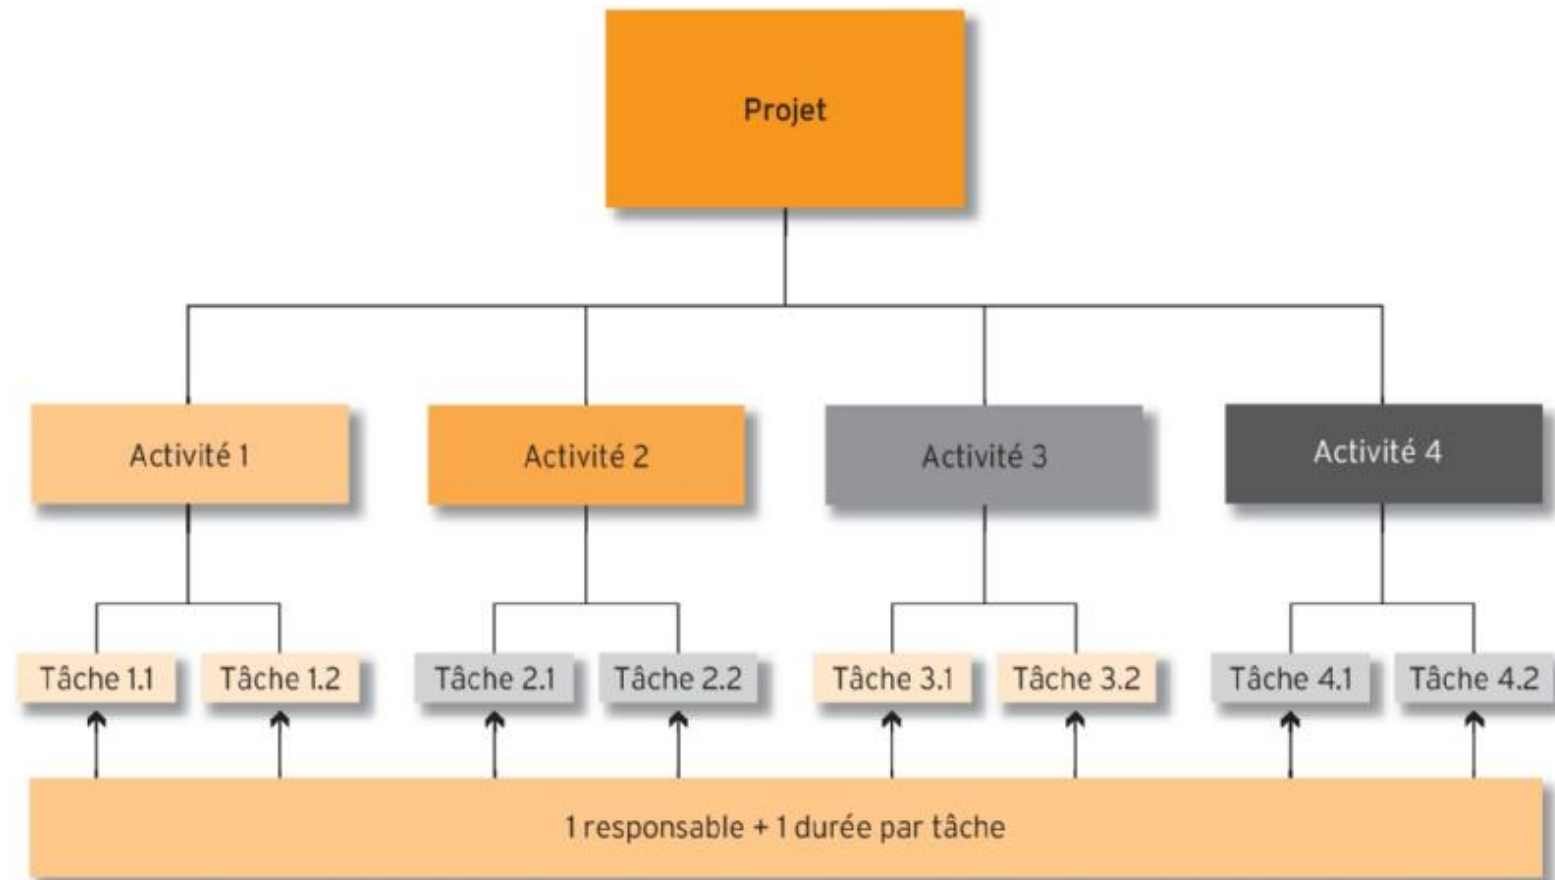


Outils (exemples)



Canva

La communication


Réussir un projet ne passe pas uniquement par une maîtrise technique du déroulement d'un projet. Il est aussi essentiel de savoir communiquer sur son projet, au sein de l'équipe projet ainsi qu'à l'extérieur afin qu'il soit compris et accepté par tous.

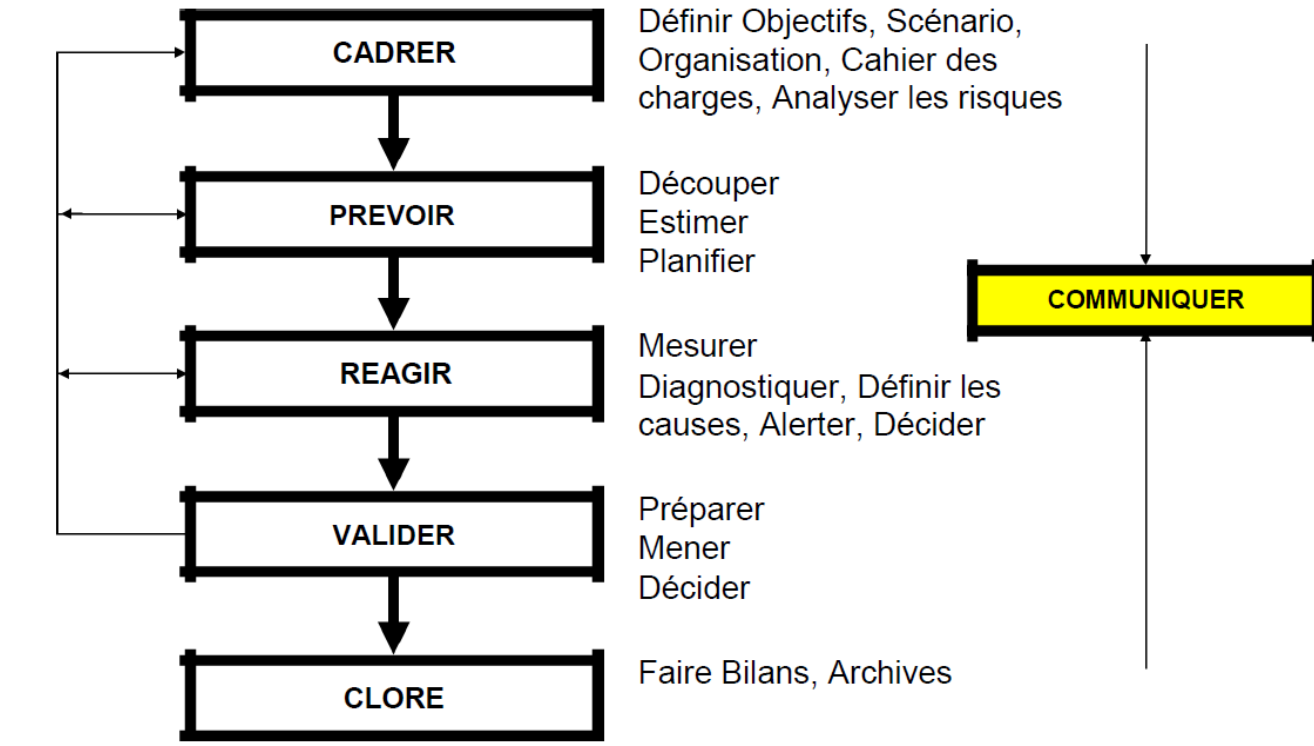

Plan de communication


Action	Pourquoi	Quoi	Comment	Qui fait	Quand	Ou	combien	Vers qui
	Objectif	Quelles Informations Je vais donner	Par Quel moyen	Qui va Organiser Et qui va animer	A quel moment Du projet	Dans quel lieu	Combien De fois et combien cela coûte	Cible partenaire (vers quels acteurs)

Etape 3 : Réagir

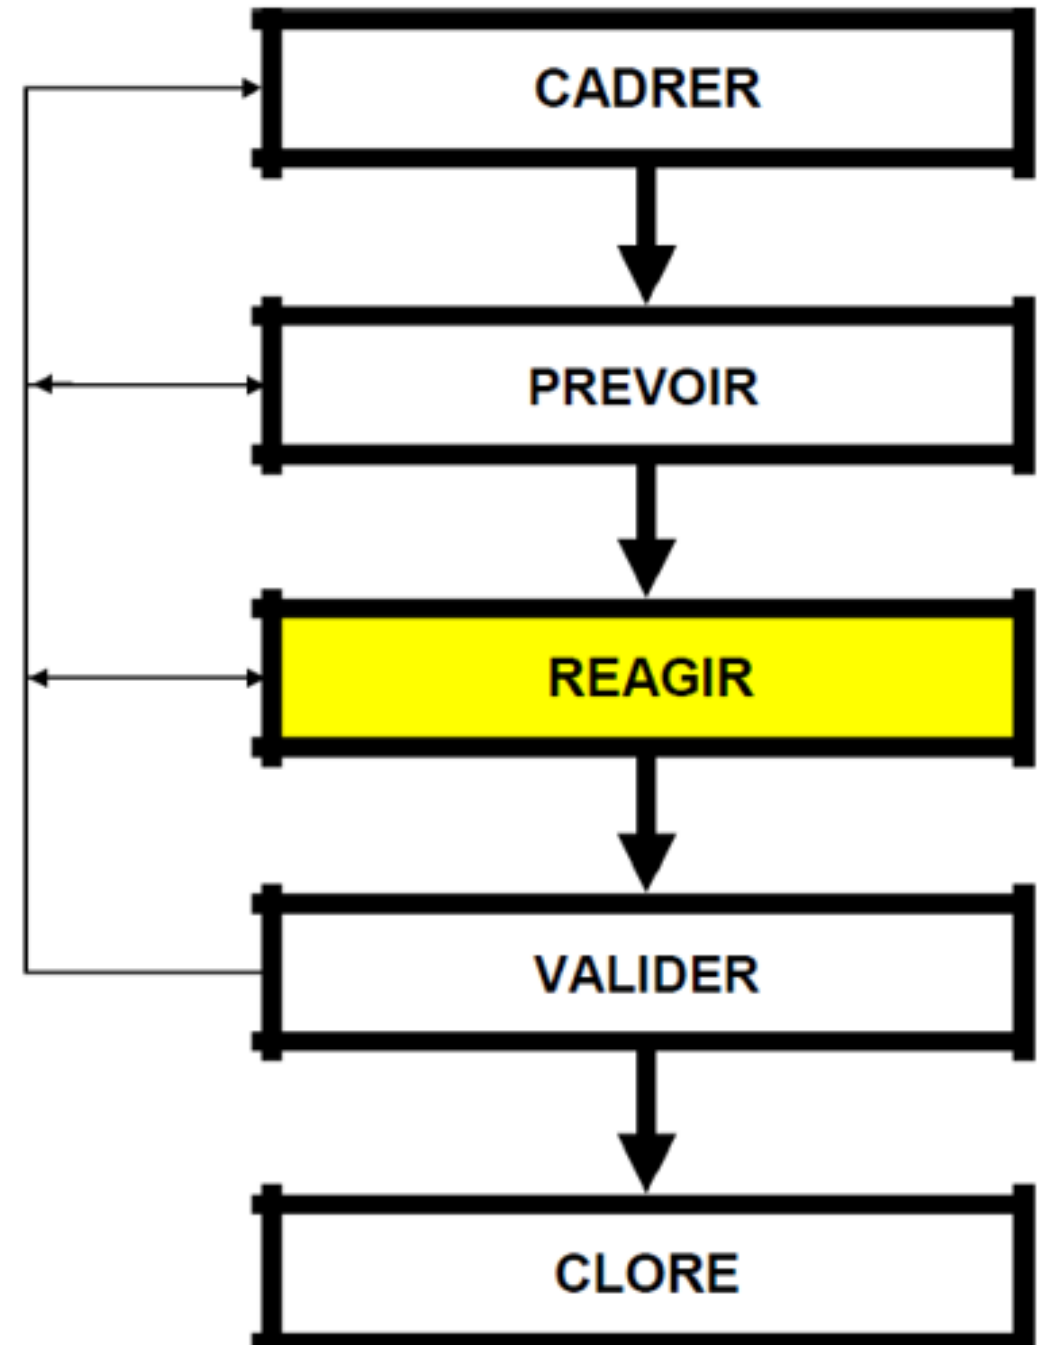


Méthode

- Contrôler l'état d'avancement du projet, à travers le PERT, le GANTT et/ou l'OTP
- Comparaison entre le prévisionnel et le réel
- Si tout va bien on continu
- Sinon analyse des problèmes et ajustement, proposition des solutions

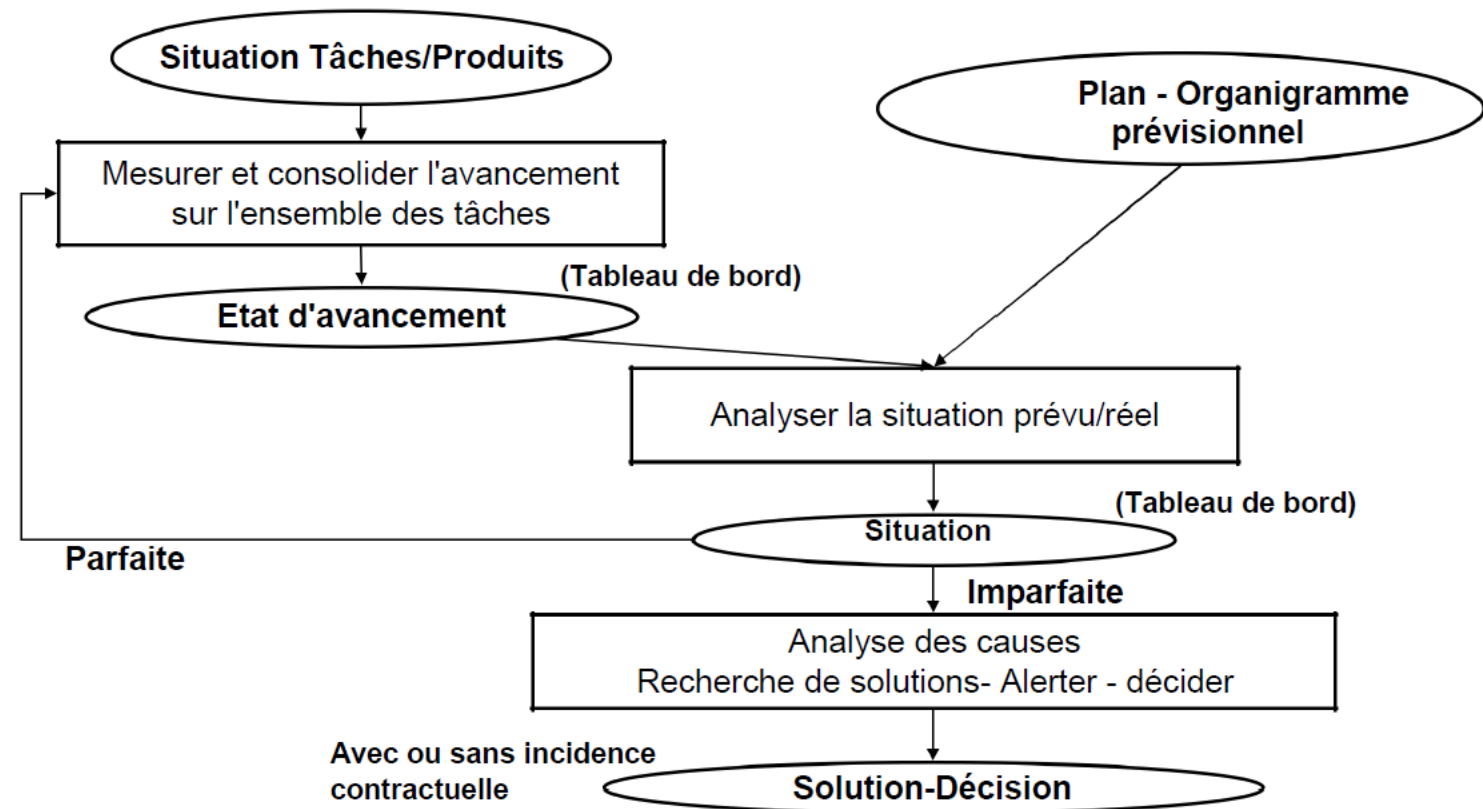


Etape 4 : Validation


- La validation des tâches par les membres concernés, généralement par le chef du projet et/ou le client
- Comparaison entre le souhaité et le réel,
Si acceptable → Validation

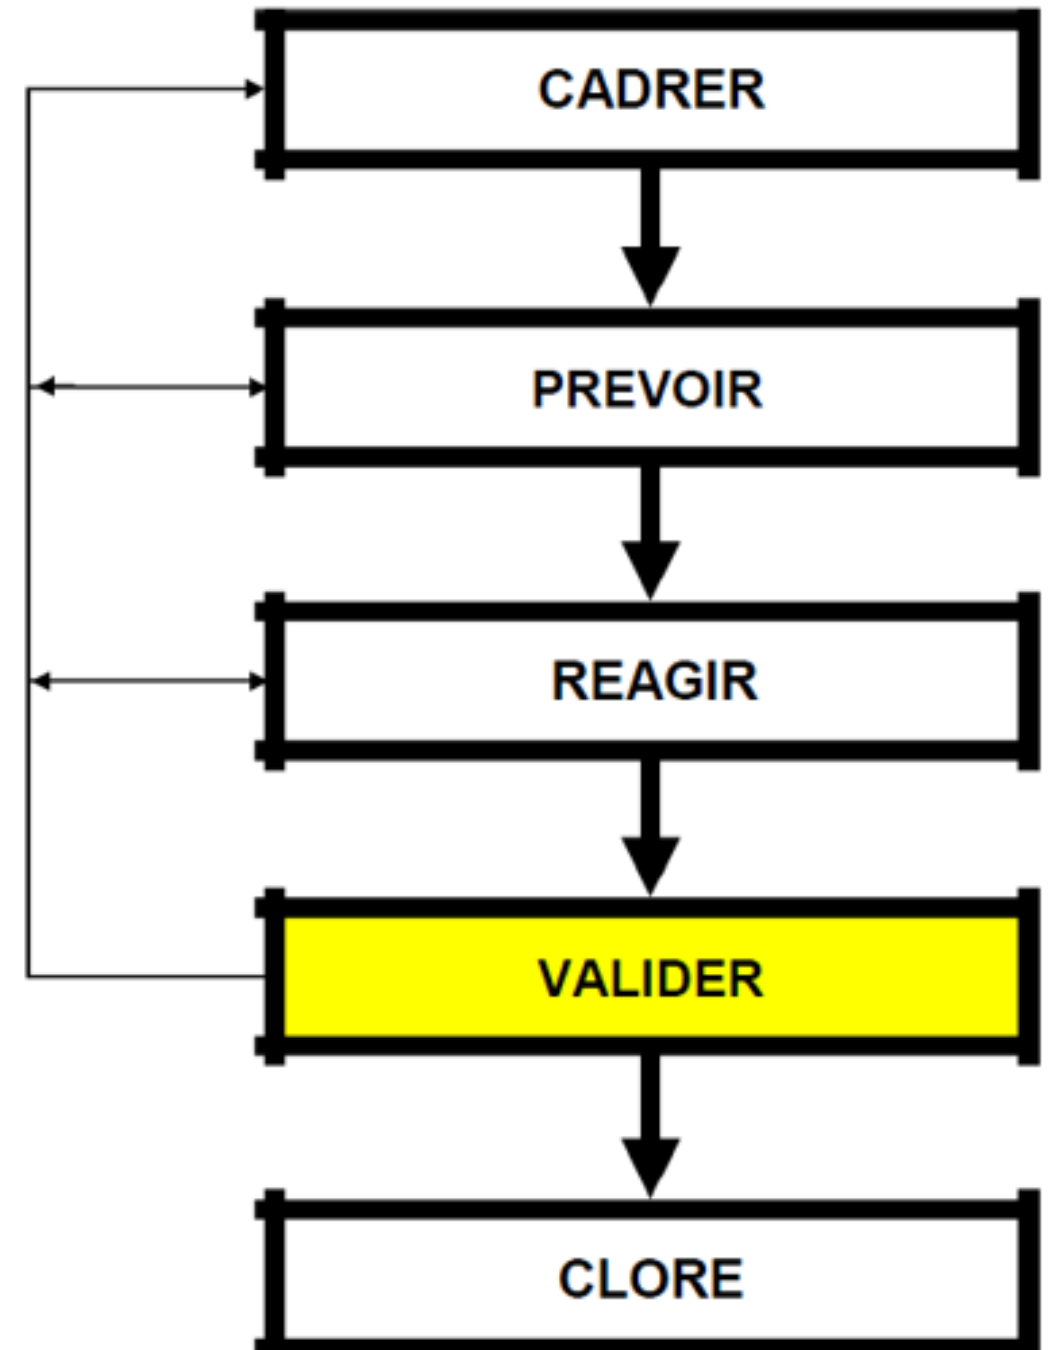

- Consiste à déterminer si chaque produit intermédiaire ou final a atteint un niveau de conformité acceptable face à ses objectifs (processus itératif).
- Chaque tâche et le projet ne seront terminés que si leurs produits ont été validés.

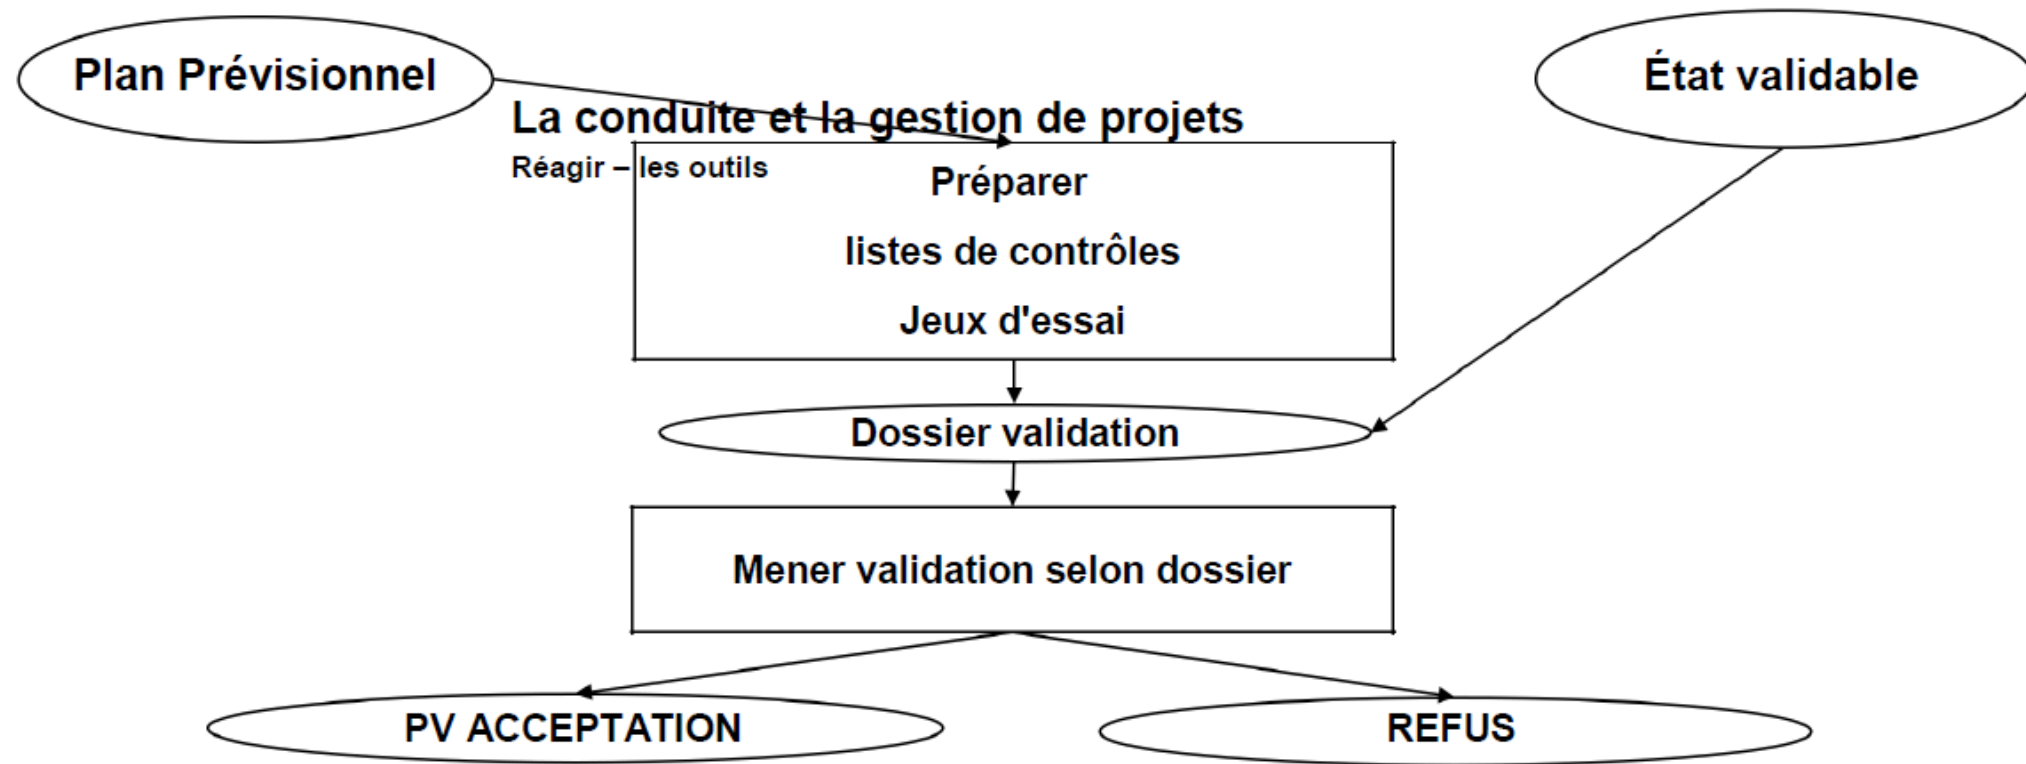


Etape 5 : Fin du projet

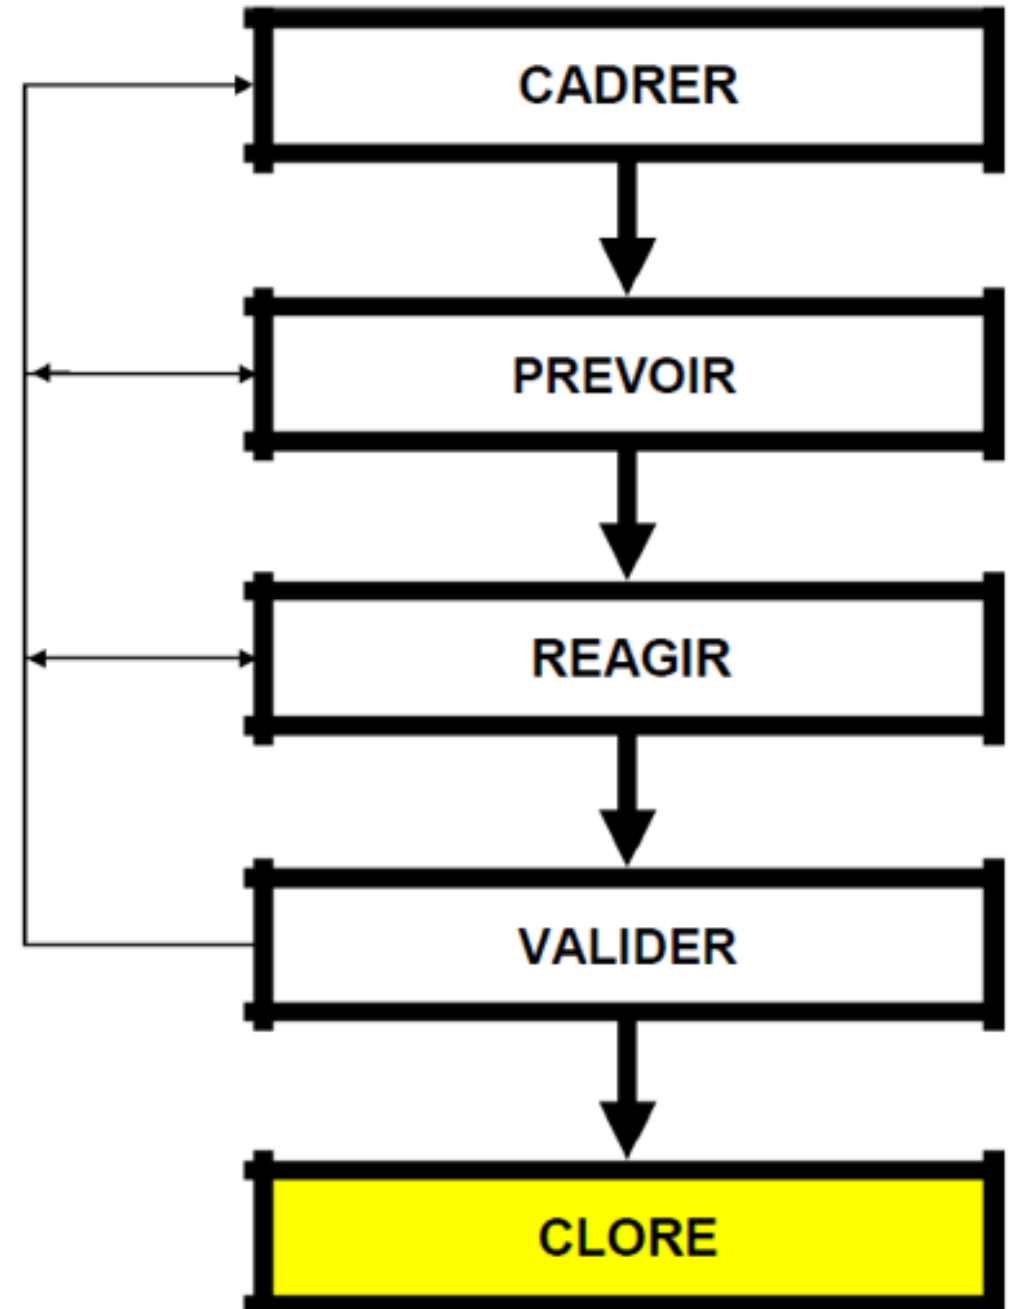

- Faire une analyse définitive du projet
- Faire les bilans du projet, une grille de bilan
- Archiver pour laisser une trace

- Analyse quantitative
 - Chiffres clés
 - Qualimétrie
- Analyse qualitative
 - Objectifs
 - Événements
 - Actions
 - Enseignements

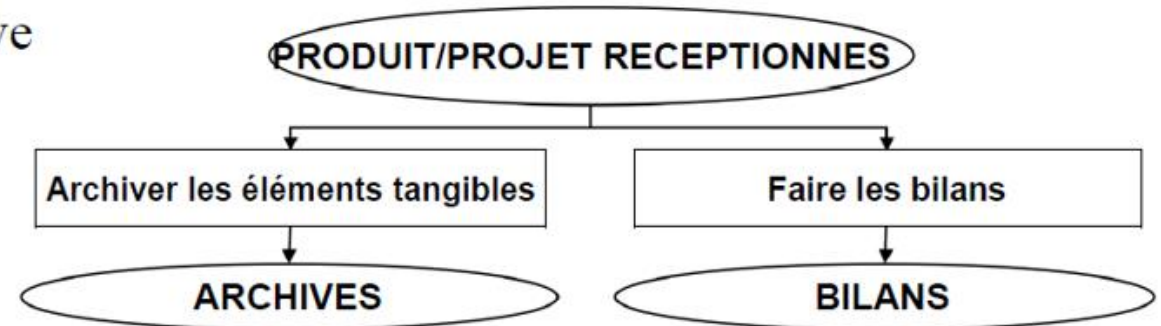

Grille de bilan

		Eléments analysés	Causes	Actions
Organisation du projet	Ce qui a bien marché +			
	Ce qu'il faut améliorer -			
Réalisation du résultat	Ce qui a bien marché +			
	Ce qu'il faut améliorer -			
