

SENSIBILISATION AGILE

Julien THEAUD

TOUR DE TABLE

ICE BREAKER

UN PEU D'HISTOIRE

...

SERIOUS GAME

SCRUM

MÉTHODE KANBAN

SERIOUS GAME

...

AGILE@SCALE

01

L'AGILITÉ

01



RÈGLES DU JEU :

En binôme, vous allez vous présenter l'un à l'autre

Sans prise de note

Finir par une anecdote personnelle/passion, objectifs au bout des deux jours de formation

Au bout des 5 minutes, réalisation d'un tour de table chacun présente son binôme

A la fin de l'exercice, vous allez vous exprimer sur ce mode de présentation



ATELIER PLACEMENT DANS L'AGILITÉ



RÈGLES DU JEU :

Chacun se place sur une ligne imaginaire unique


Stand-up collectif
Evaluer votre niveau

02

UN PEU D'HISTOIRE



LE CYCLE DE DÉVELOPPEMENT « EN V »

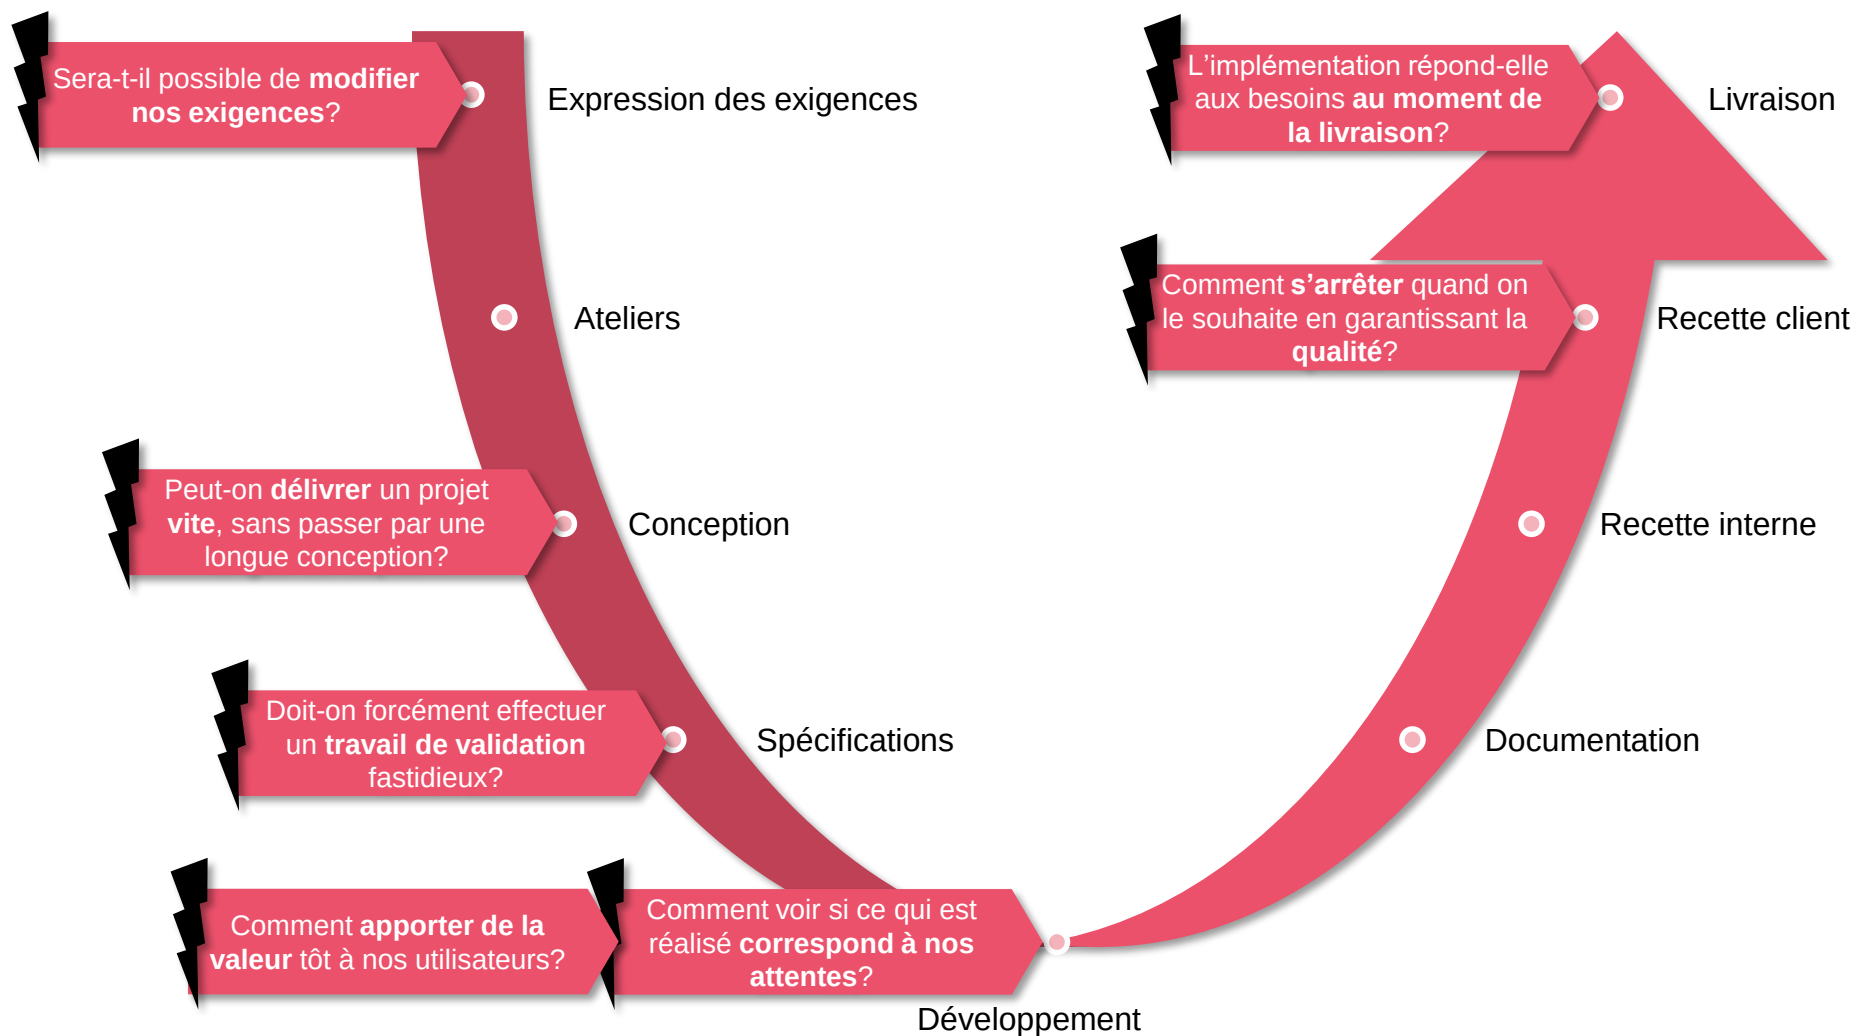

SEPT RAISONS D'ÉCHEC DES PROJETS IT

Objectif mal ou
pas défini

Manque de
leadership /
support


Manque de
responsabilité

Manque de
communication

Pas de planning
ou de jalons

Pas de retours
utilisateur, ou
retours mal
adressés

Résolution du
mauvais
problème

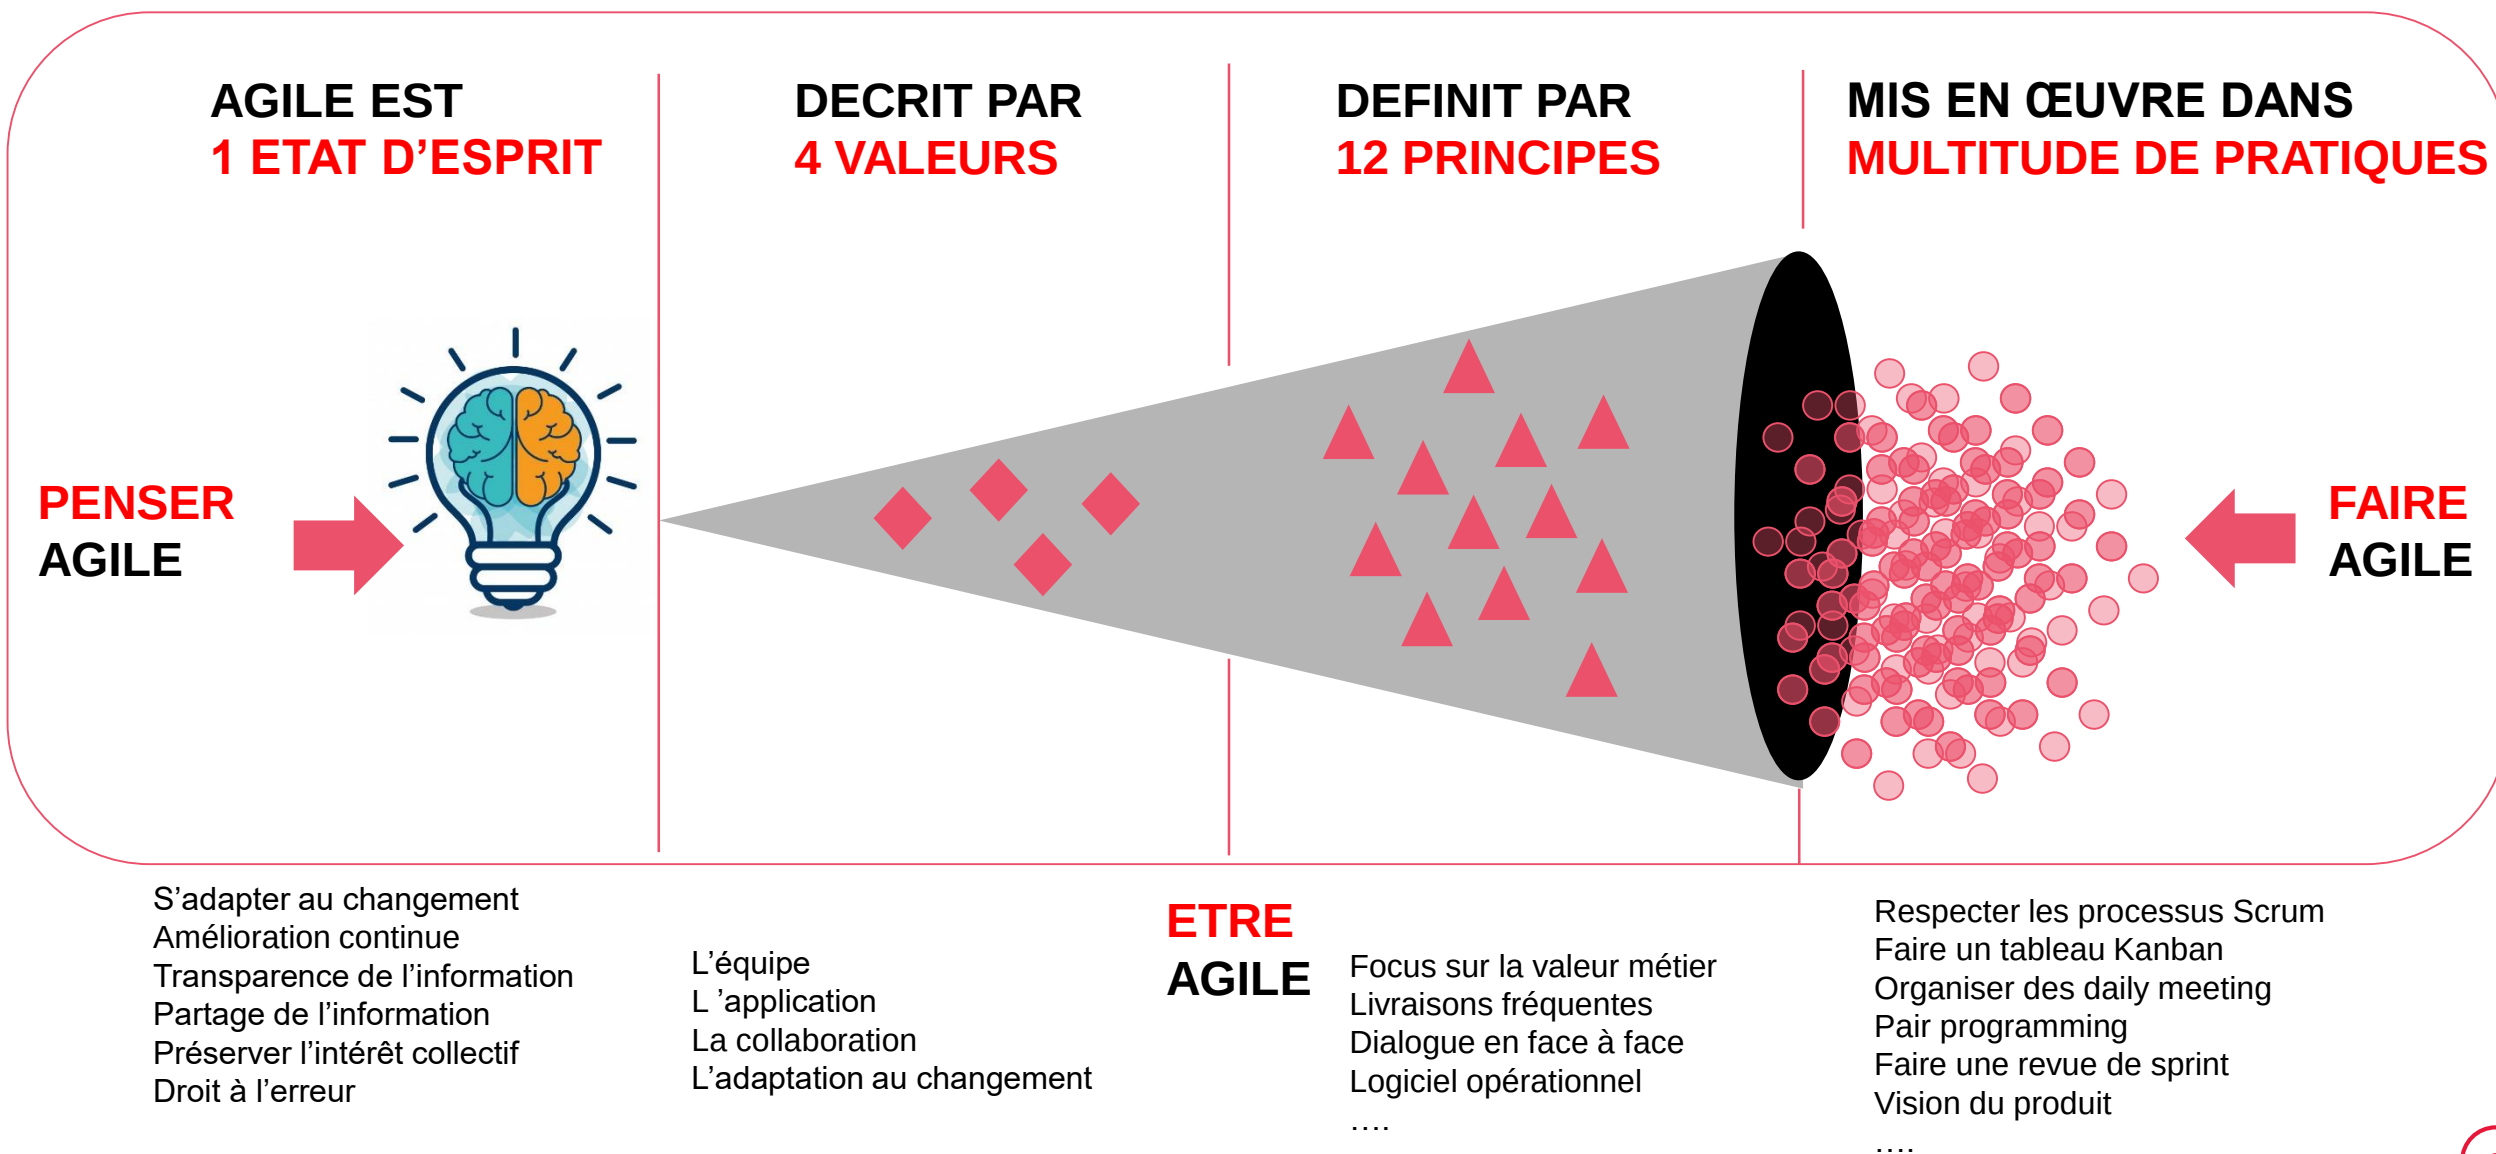

LES FONDEMENTS : MANIFESTE AGILE - 2001

« Nous découvrons comment mieux développer des logiciels
par la pratique et en aidant les autres à le faire »



Les personnes et leurs interactions sont plus importantes que les processus et les outils



Un logiciel qui fonctionne prime sur de la documentation



La collaboration est plus importante que le suivi d'un contrat



La réponse au changement passe avant le suivi d'un plan



*Les premiers sont à privilégier mais
n'empêchent pas le deuxième*



Satisfaire
le client



Accueillir
le changement



Livrer
fréquemment



Travailler
ensemble



Equipe
motivée



Dialogue
en face à
face



Logiciel
Opérationnel



Rythme
constant



Excellence
technique



Simplicité




Equipes
auto-organisées



Réfléchir et
ajuster

DÉLIVRER EN AGILE, QU'EST-CE QUE ÇA CHANGE?


L'APPROCHE AGILE GARANTIT LE BUDGET ET LE PLANNING PAR UN ARBITRAGE FONCTIONNEL (BASÉ SUR LA PRIORITÉ, LE DÉLAI ET LE COÛT).

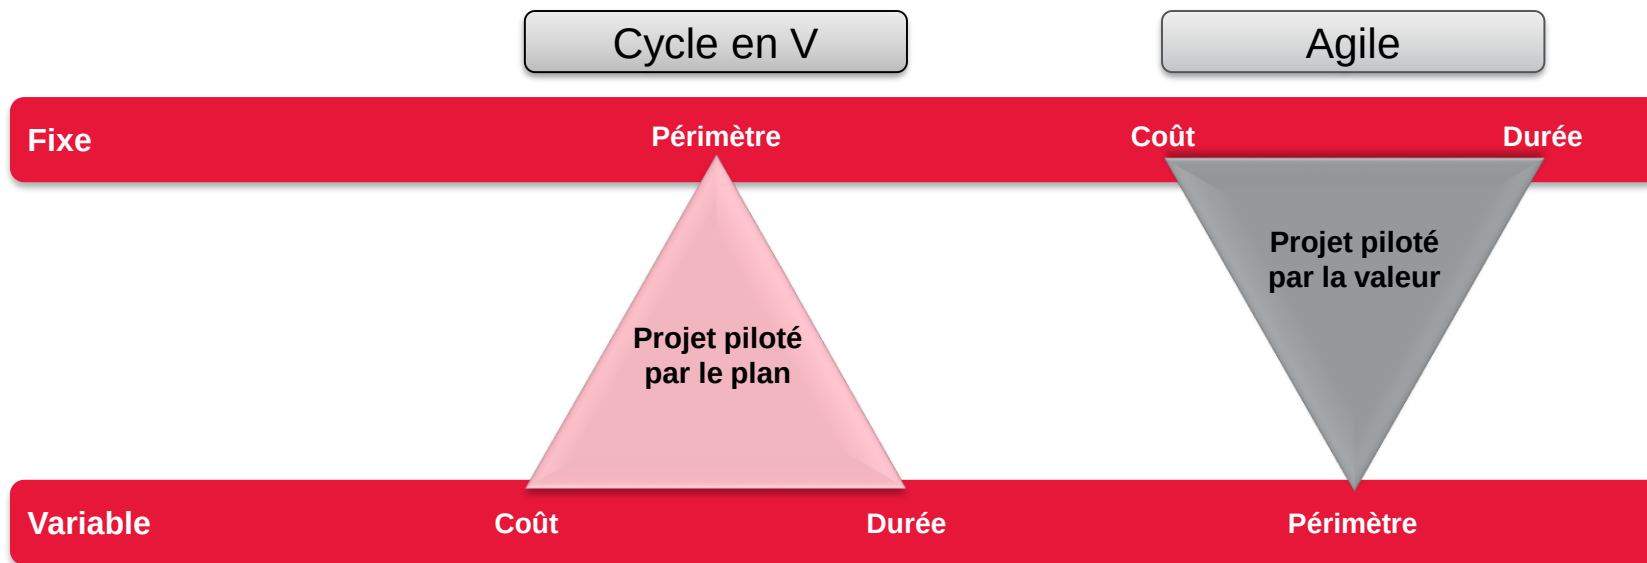


Qu'est-ce qu'un projet agile ?

- Livrer de manière **itérative et incrémentale** une liste de fonctionnalités **définies** et **priorisées** par le client.
- Entre chaque itération, avoir la capacité de **réévaluer la priorité des besoins métier**.

Not like this....



Like this!

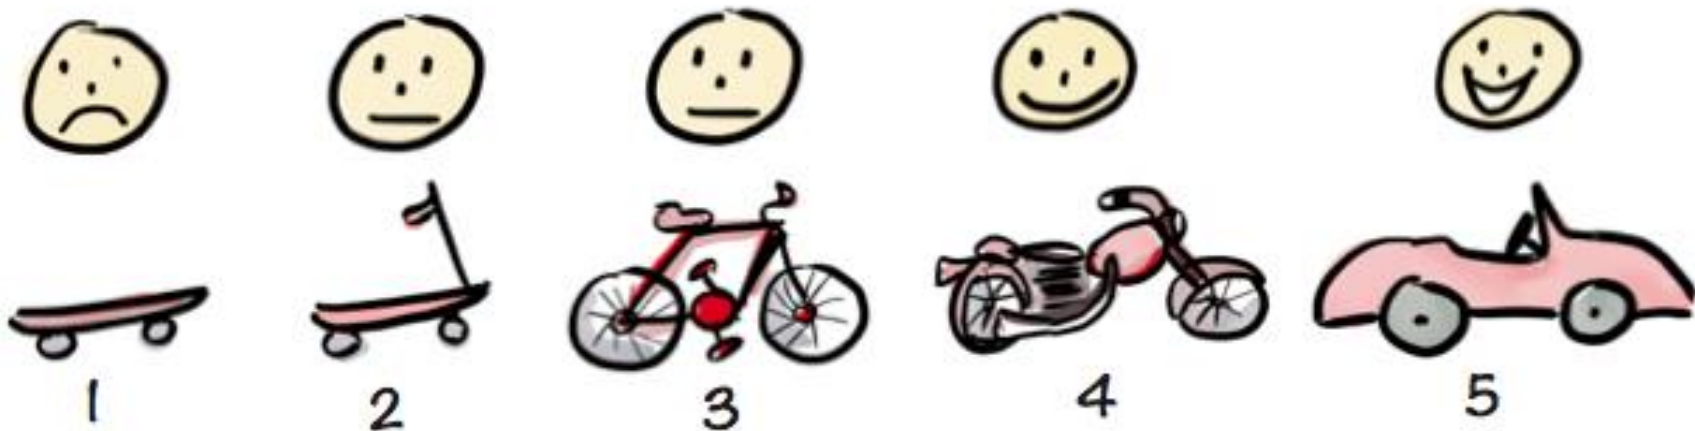

Agile Mindset

4 principes

12 valeurs

Frameworks Agile

Scrum

Kanban

XP

LeSS

Scaled Agile
Framework...

03

EXTREM PROGRAMMING

03



INTRODUCTION AGILE – LES 5 VALEURS EN XP

L'EXTREME PROGRAMMING REPOSE SUR CINQ VALEURS FONDAMENTALES :

La communication

Moyen fondamental pour éviter les problèmes. Les tests, la programmation en binôme et le jeu du planning obligent les développeurs, les décideurs et les clients à communiquer. Si un manque apparaît malgré tout, un coach se l'identifie et remet ces personnes en contact.

La simplicité

La façon la plus simple d'arriver au résultat est la meilleure. Anticiper les extensions futures est une perte de temps. Une application simple sera plus facile à faire évoluer.

Le feedback

Les tests unitaires indiquent si le code fonctionne. Les tests fonctionnels donnent l'avancement du projet. Les livraisons fréquentes permettent de tester rapidement.

Le courage

Il faut parfois changer l'architecture d'un projet, jeter du code pour en produire un meilleur ou essayer une nouvelle technique. Le courage permet de sortir d'une situation inadaptée.

Le respect

Respecter son travail et celui des autres : on ne commit pas un code qui ne compile pas, qui fait échouer des TU. Personne ne doit être ignoré (ajouté dans la v2)

CLIENT SUR SITE

PLANNING POKER

INTÉGRATION CONTINUE

PETITES LIVRAISONS

RYTHME SOUTENABLE

TESTS UNITAIRES

**TESTS DE RECETTE (OU TESTS
FONCTIONNELS)**

UTILISATION DE MÉTAPHORES

CONCEPTION SIMPLE

REFACTORING (OU REMANIEMENT DU CODE)

APPROPRIATION COLLECTIVE DU CODE


CONVENTION DE NOMMAGE

PROGRAMMATION EN BINÔME

04

SERIOUS GAME

04

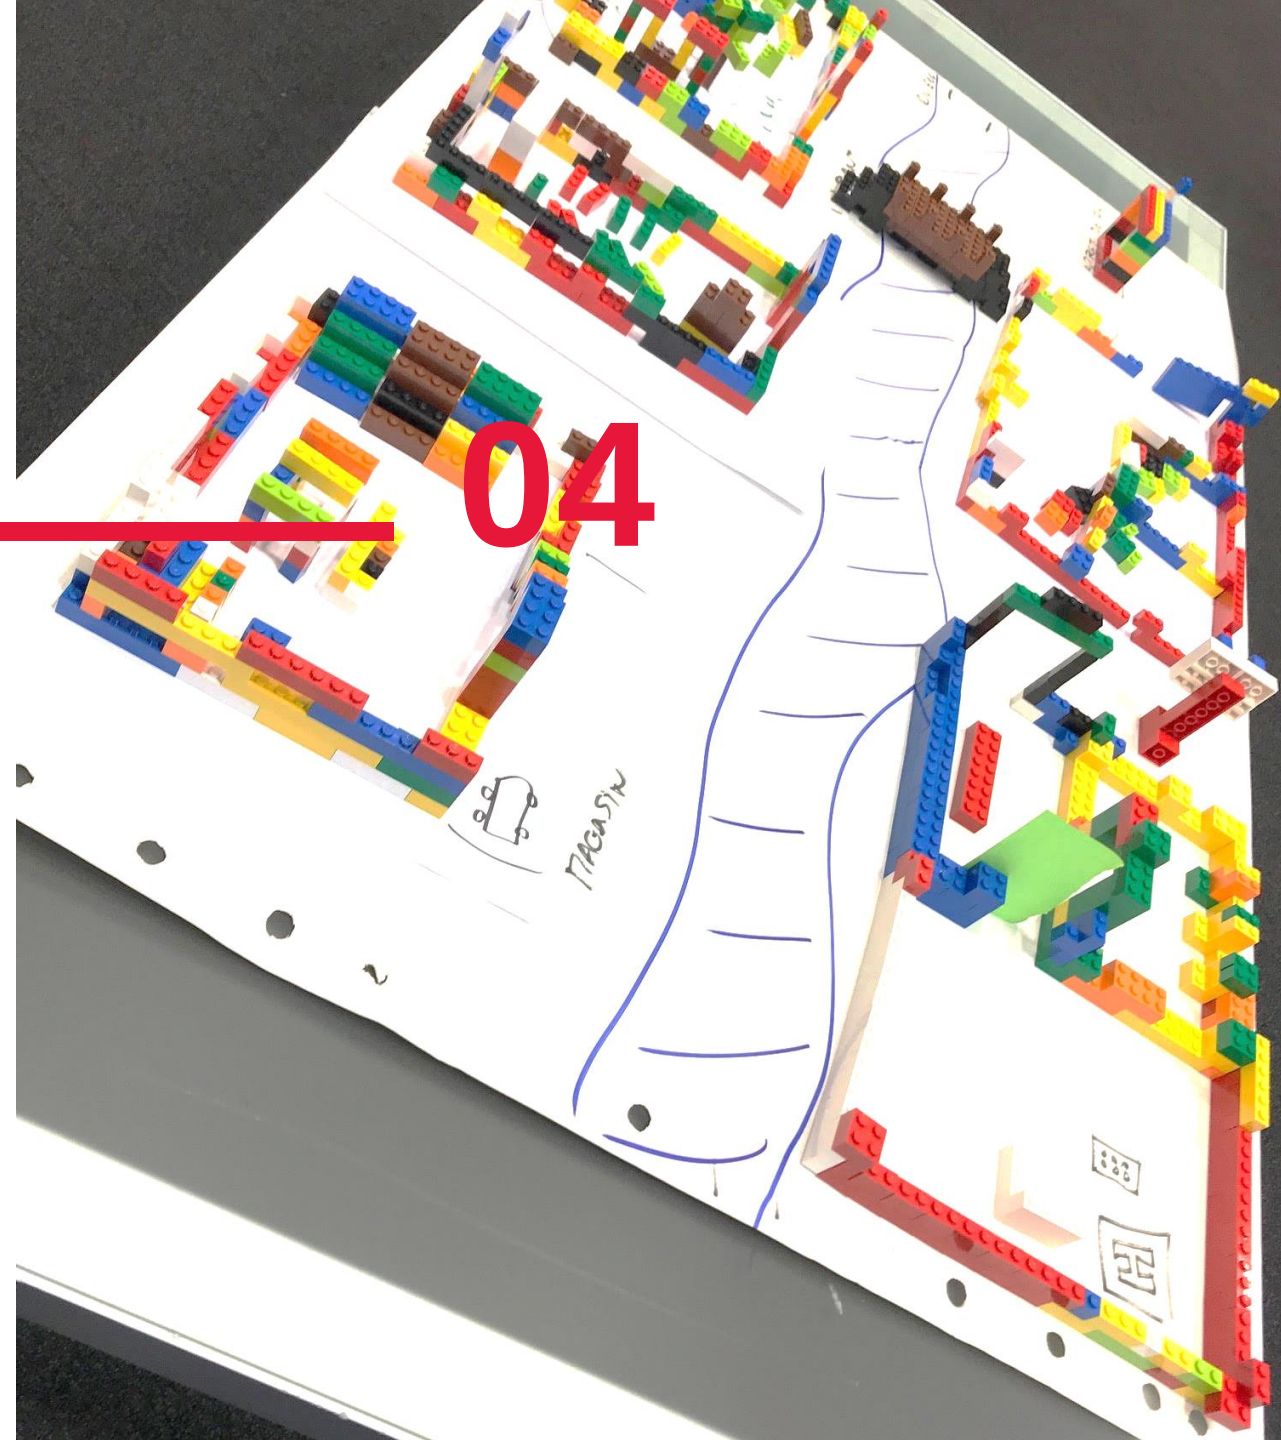



□ UNE TABLE PAR ÉQUIPE

20 SPAGHETTI (CRUES ET ASSEZ ÉPAISSES),

1 MÈTRE DE RUBAN ADHÉSIF ,

1 MÈTRE DE FICELLE ET...

UN MARSHMALLOW BIEN SÛR !!

□ L'OBJECTIF: CONSTRUIRE LA STRUCTURE LA PLUS HAUTE ET QU'ELLE SOIT AUTONOME ! L'ÉQUIPE GAGNANTE EST CELLE QUI A LA STRUCTURE LA PLUS GRANDE MESURÉE DEPUIS LA SURFACE DE LA TABLE JUSQU'AU MARHSMALLOW. CECI SIGNIFIE QUE LA STRUCTURE NE PEUT PAS ÊTRE SUSPENDUE À UNE STRUCTURE SUPÉRIEURE, COMME UNE CHAISE, UN PLAFOND OU UN LUSTRE. SI LES SPAGHETTIS MONTENT PLUS HAUT QUE LE MARSHMALLOW, ON MESURE BIEN DE LA BASE JUSQU'À CELUI-CI.





UN MARSHMALLOW ENTIER ! LE MARSHMALLOW ENTIER DOIT ÊTRE AU SOMMET: COUPER OU MANGER UNE PARTIE DE LA GUIMAUVE DISQUALIFIE L'ÉQUIPE.

BONNE UTILISATION DU KIT: L'ÉQUIPE PEUT UTILISER COMME ELLE LE SOUHAITE DANS LES RESSOURCES QUI LUI SONT FOURNIS LE KIT : 20 SPAGHETTIS, 1 MÈTRE DE FICELLE, 1 MÈTRE DE BANDE ADHÉSIVE. LES ÉQUIPES SONT LIBRES DE BRISER LE SPAGHETTI, DE DÉCOUPER LA BANDE ET LA FICELLES POUR CRÉER LEUR STRUCTURE.

TIMEBOXING: LE DÉFI DURE 18 MINUTES EXACTEMENT ! LES ÉQUIPES NE DOIVENT PAS TENIR LEUR STRUCTURE LORSQUE LE TEMPS EST ÉCOULÉ. CEUX QUI TOUCHENT OU SOUTIENNENT LA STRUCTURE À LA FIN DE L'EXERCICE SONT DISQUALIFIÉS.

LES POINTS CLÉS:

- On est focalisé sur le produit
- Construction Incrémentale et interactive
- On pilote par la valeur **délivrée**
- Equipes autonomes et auto organisées

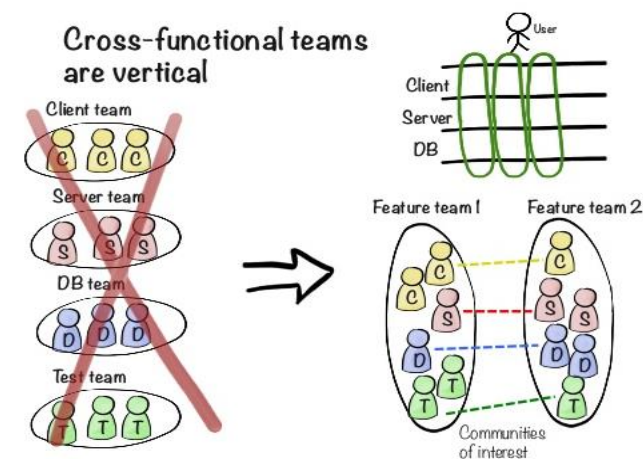

05

SCRUM



Philosophie vs framework

- Framework = cadre de travail
- On choisit les concepts, processus, outils à intégrer


Scrum est un framework agile

- Cadre avec un certain nombre d'outils et de processus
- Règles et principes à respecter
- On ne peut faire n'importe quoi sous prétexte de l'agilité

Vrai ou faux agile?

- On peut utiliser certains concepts, pas d'autres
- A vous de définir votre façon de travailler au fil de l'eau
- A vous de fixer ces règles et principes ensemble


LA VIE D'UN PRODUIT RÉALISÉ EN SCRUM

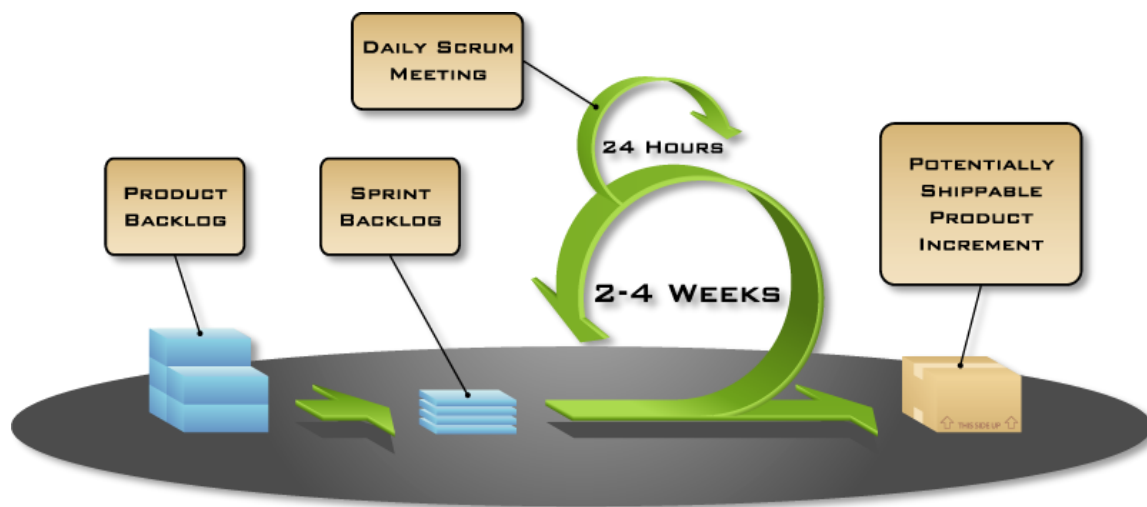

COPYRIGHT © 2005, MOUNTAIN GOAT SOFTWARE

- UN SPRINT = UNE ITÉRATION COURTE (2-4 SEMAINES).
- PENDANT UN SPRINT : CONCEPTION, DÉVELOPPEMENT, RECETTE ET DÉPLOIEMENT.
- UNE RELEASE = UN ENSEMBLE DE SPRINTS QUI COMPLÈTE LA VISION GLOBALE DU PRODUIT.
- AU TERME D'UN SPRINT, L'ÉQUIPE EST CAPABLE DE FOURNIR UN **INCRÉMENT DE PRODUIT LIVRABLE** (PAR EXEMPLE, EN PRODUCTION).

UNE VISION RÉALISTE DU DÉROULEMENT D'UN PROJET

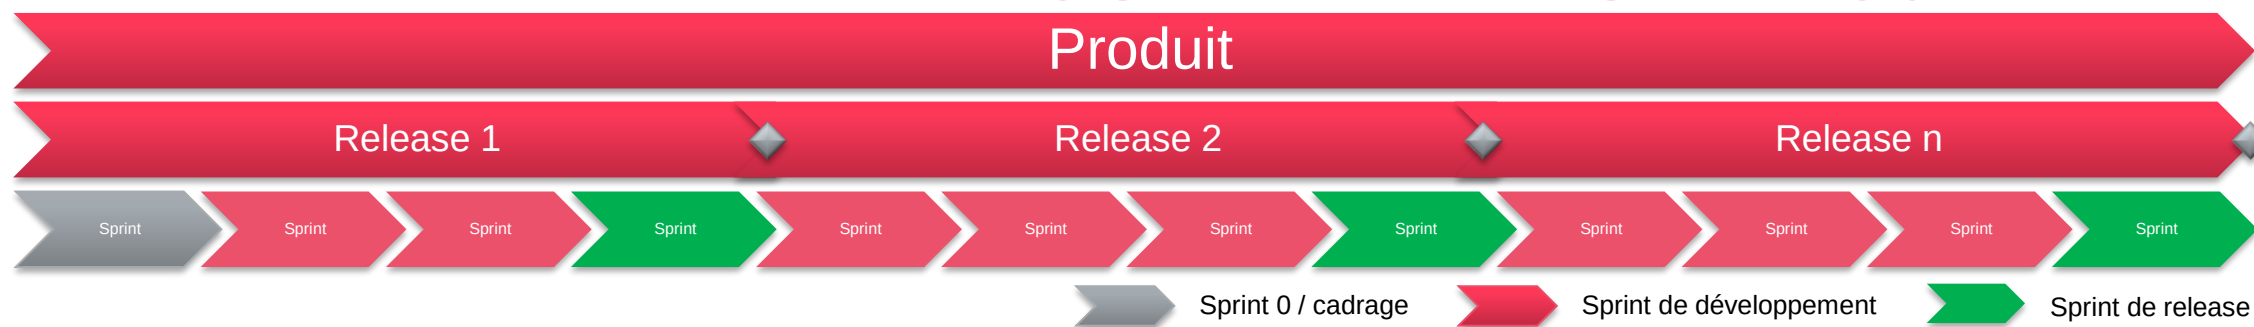

Cadrer

- Cadrage fonctionnel, technique, organisationnel.
- Définition de tous les éléments nécessaires à la réussite du projet.
- Complétion et priorisation du backlog en début de projet.
- Ateliers et conception sur les aspects fonctionnel, technique, graphique.
- Mise en place des prérequis techniques, rodage des process de livraison.
- Mise en place des indicateurs de pilotage.
- Montée en compétence technico-fonctionnelle de l'équipe.

Produire

- Analyse, développement, tests et livraison par l'équipe des use cases demandés.
- Réunions de priorisation, planification, analyse, information, démonstration, amélioration continue.
- Validation au fil de l'eau par le client des fonctionnalités livrées, faisant office d'accord pour mise en production en fin de projet.
- Correction des anomalies remontées lors des sprints précédents pour garantir la qualité.

Finaliser

- Sprint dédié à la correction d'anomalies résiduelles ou à de petits ajustements.
- Validation finale des développements.
- Finalisation de la documentation.
- Formations, conduite du changement.
- Livraison finale de l'ensemble des fonctionnalités.
- Planification de la release suivante.

Piloter

- Une gouvernance tout au long du projet qui garantit proximité et réactivité et sécurise les engagements
- Un partage en toute transparence des indicateurs de réussite du projet et une comitologie adaptée

LES RÔLES DANS UN PROJET SCRUM



Les parties prenantes

- Définissent leurs besoins pour le produit
- Assistent aux démonstrations
- Donnent du feedback sur le produit



Le Product Owner

- Dispose de la vision du produit
- Est garant(e) du produit final
- A la capacité et la légitimité pour arbitrer
- Définit les jalons tout au long du projet
- Est disponible et impliqué



Les équipiers

- Sont en charge de toutes les tâches nécessaires pour mener à bien les stories
- Estiment, conçoivent, développent, testent, rédigent des documents...
- Sont polyvalents



Scrum Master

- Coordonne / facilite
- Garant du respect des processus
- Elimine les obstacles qui ralentissent ou bloquent l'équipe
- Aide l'équipe en la rendant autonome

VUE D'ENSEMBLE SCRUM

3 rôles



Product Owner



Scrum Master



l'équipe de réalisation


4 artefacts




product backlog



Scrum board




burndown chart




produit


4 cérémonies



planification de sprint



daily Scrum



revue de sprint



rétrospective

LE FRAMEWORK DE SCRUM VU D'AVION

3 ROLES

1. Development Team
2. Product Owner
3. Scrum Master


(L'ensemble compose la **Scrum Team**)

4 ARTEFACTS

4. Product Backlog
5. Sprint Backlog
6. Sprint Burndown Chart
7. Increment

4 CEREMONIES

8. Sprint Planning
9. Daily Scrum
10. Sprint Review
11. Sprint Retrospective

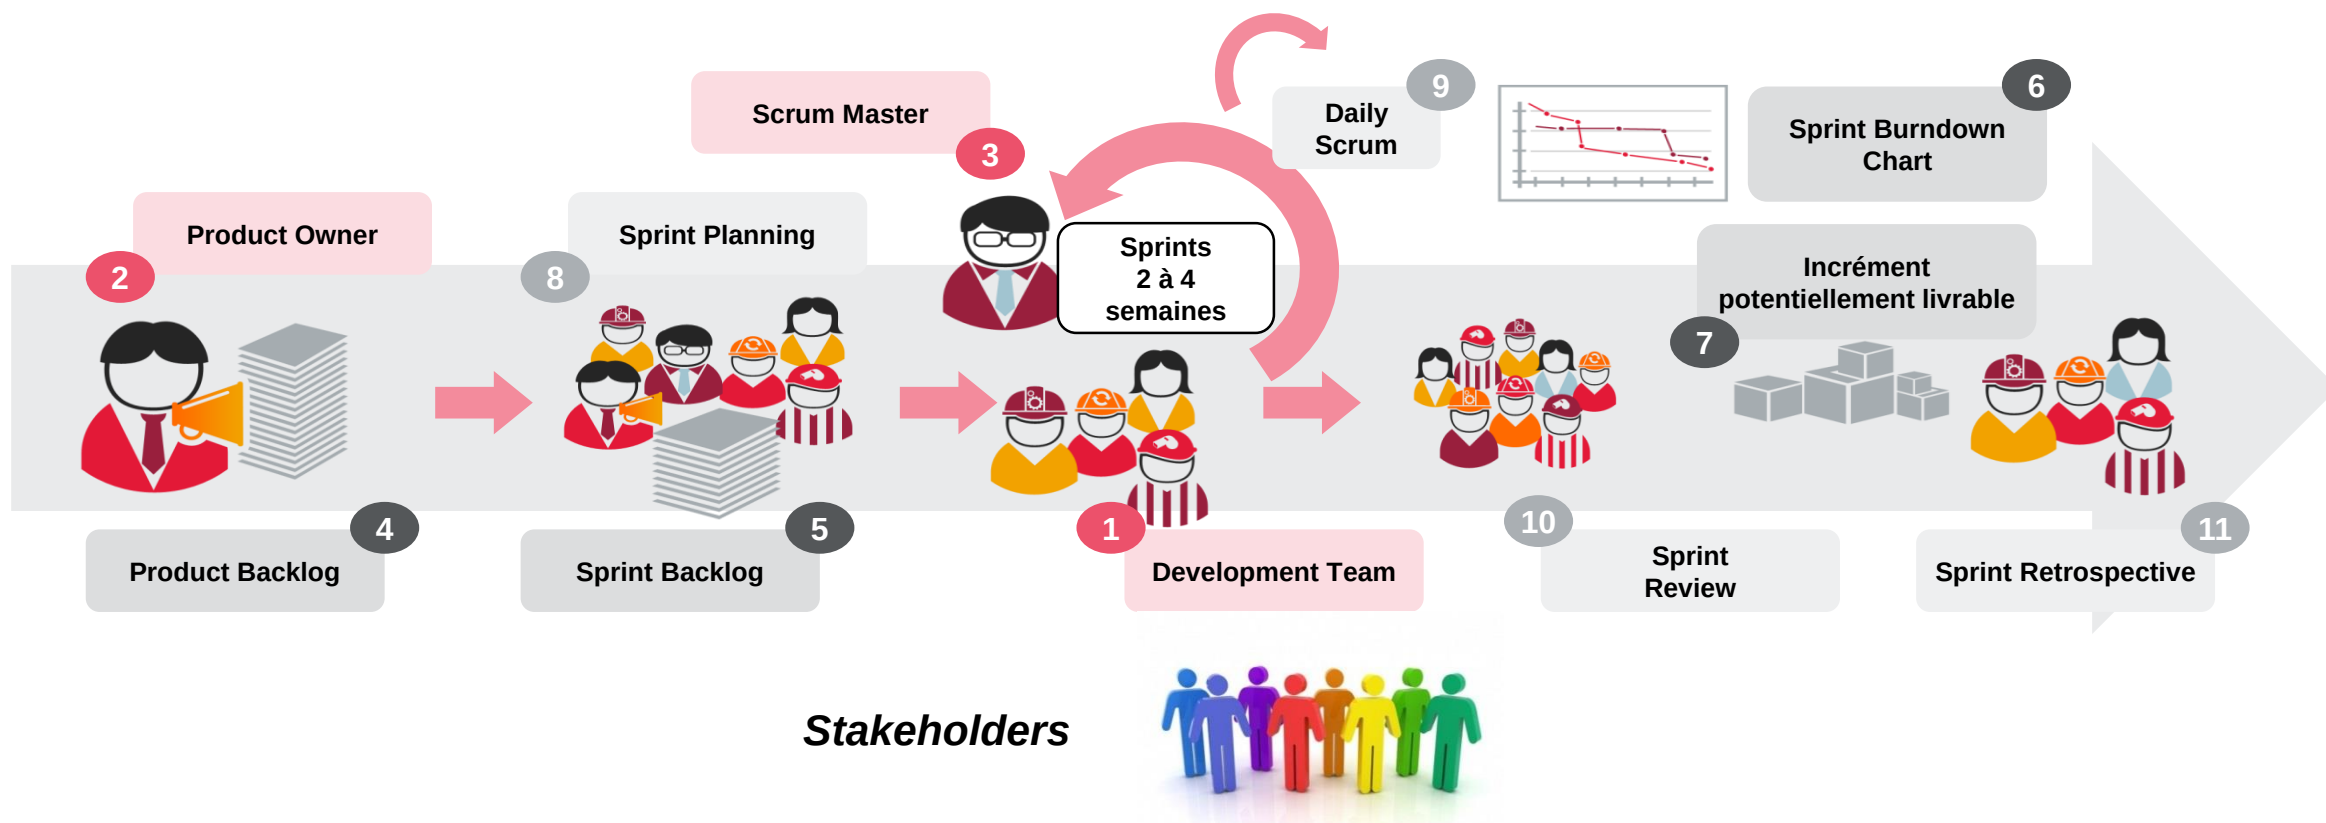

S'améliorer

Sprint retrospective

L'équipe fait le point sur les aspects positifs et les axes d'amélioration suite au sprint. Il en découlera la mise en place d'actions d'amélioration sur le sprint suivant.

Démontrer

Démonstration / Sprint review

L'équipe fait une démonstration au métier de la valeur qui a été apportée au produit. Cela permet aussi d'identifier de nouveaux besoins et d'obtenir un feedback sur ce qui a été réalisé.


Informar

Daily Meeting

Chaque membre de l'équipe rend compte chaque jour de ses avancées de la veille, de ce qu'il/elle va faire aujourd'hui et des obstacles qu'il/elle rencontre.

Produire de la valeur

L'équipe accomplit toutes les tâches qui vont permettre la finalisation de chaque story : analyse, développement, tests, livraison, autres.

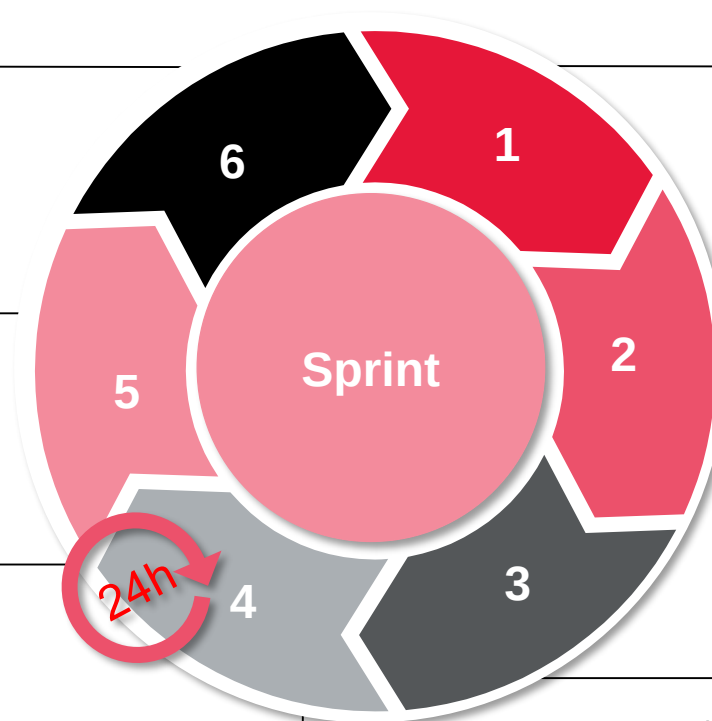

Prioriser

Comité de priorisation

Le Product Owner doit garder le Product Backlog priorisé en permanence afin d'avoir une vision constamment claire des prochains sujets à traiter.

Préparer

Revue de backlog

Avant chaque sprint, le Product Owner complète le backlog avec de nouveaux besoins, que l'équipe chiffre, et redéfinit ses priorités.

Planifier

Sprint Planning Meeting

Le backlog du sprint est défini en fonction de la priorisation du PO, de la capacité de l'équipe et des estimations fournies. L'équipe découpe les user stories à réaliser sur ce sprint en tâches plus petites, identifiant dans le même temps le travail à réaliser.

Atelier pratique



CGI

La force de l'engagement^{MD}

ATELIER CONSTRUCTION D'UN BACKLOG PRODUIT MISE EN PRATIQUE

S'assurer de la bonne compréhension des règles

Prioriser les actions dans le but de fournir des US terminés

Description du besoin

Priorisation métier

Critère d'acceptation

Ne pas accepter/travailler sur une US non matures, dont la compréhension prête à confusion

ARTEFACTS

Activités, ou étapes chronologiques du processus métier

Priorités
MoSCoW

MUST

Créer fiche client

Calcul facture

Edition papier

Créer RDV

Modif RDV

Liste RDV

Clients impayés

SHOULD

Modif fiche client

Envoi mail

Suppr RDV

Clients fidèles

COULD

Supprime fiche client

Consultation internet

Tableau de bord

Tableau de bord

WISH

Notification SMS

Mail automatisé


LA VÉLOCITÉ DE L'ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT

Elle correspond au nombre de points de complexité réalisable par l'équipe de développement durant une itération, en tenant compte des éléments extérieurs prévisibles (congés, problèmes sur les environnements de développement)

Elle est affinée à chaque itération

Pour la 1^{ère} itération, elle est estimée

LE GRAPHE D'AVANCEMENT D'ITÉRATION (BURNDOWN)

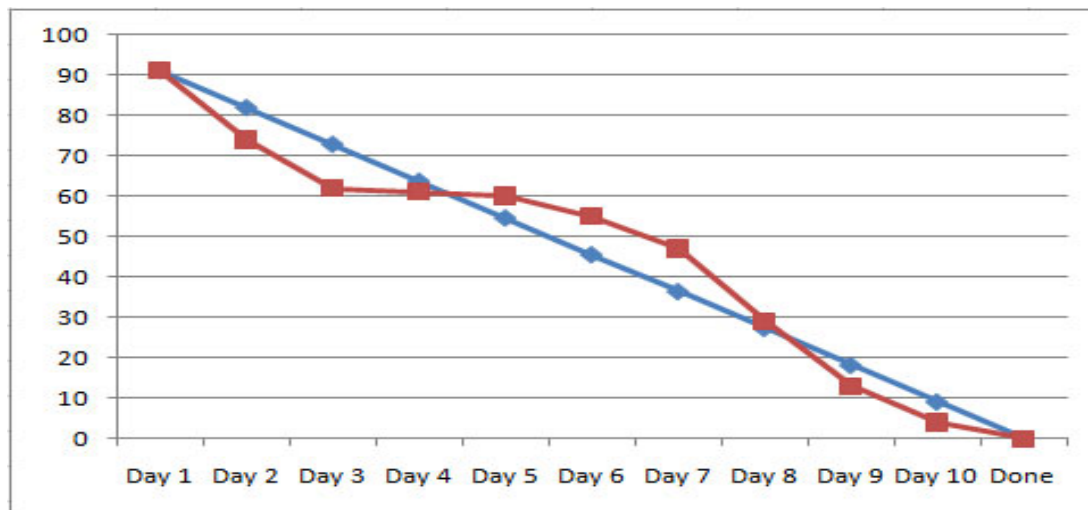


Permet d'évaluer la probabilité qu'à la fin de l'itération, tous cas d'usage soient finis

Permet d'ajuster l'ordre de production dans les mêlées quotidiennes

LE GRAPHE DE CRÉATION DE VALEUR (PRODUCT BURNUP)

Représente le cumul de valeur déjà produite ainsi que l'estimation de la valeur du carnet de produit

Permet d'estimer la date de complétude fonctionnelle

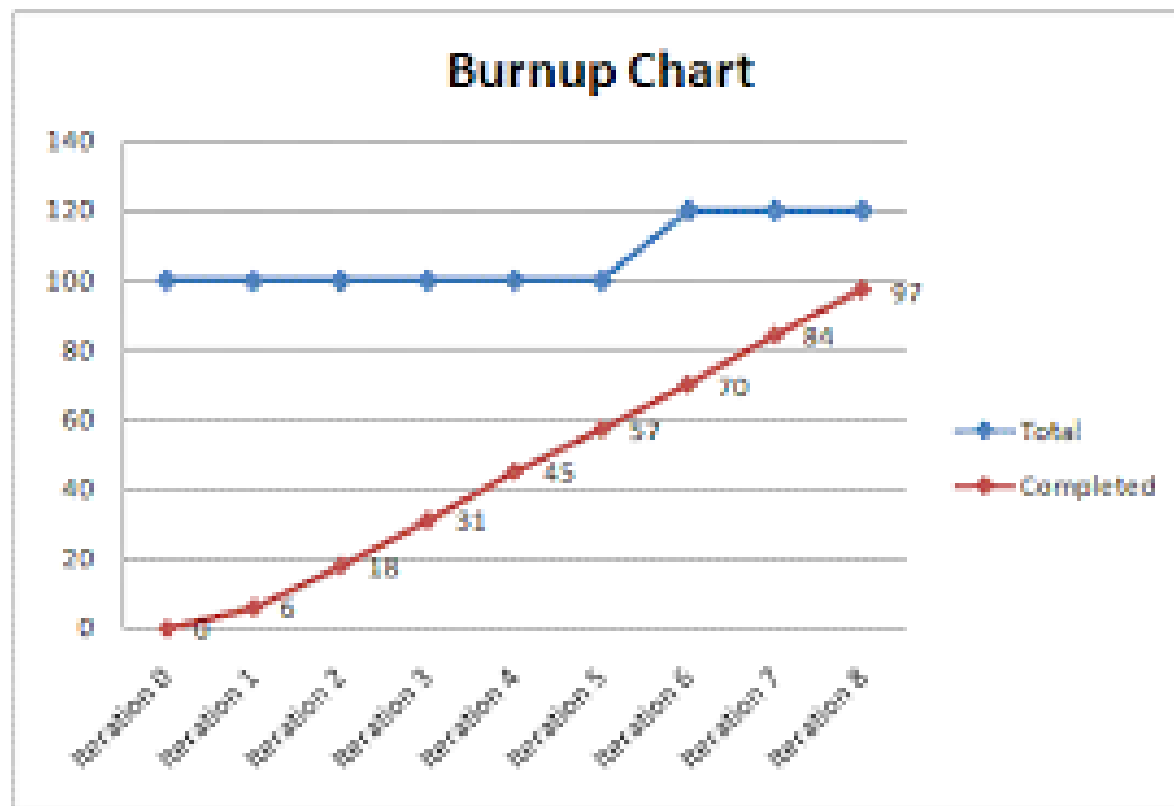

Atelier pratique



CGI

La force de l'engagement^{MD}

JEU « OPEN-END STORIES »

10 MIN





Objectif

Réaliser un dessin sur la base d'un cahier de charges fourni



FORMER 2 ÉQUIPES

LE JEU SE DÉROULE EN DEUX PHASES. LORS DE LA PREMIÈRE PHASE L'ÉQUIPE 2 EST INVITÉ À SORTIR DE LA SALLE.



PHASE 1 – EQUIPE 1

VOUS AVEZ 2 MINUTES POUR RÉALISER UN DESSIN SUIVANT LE CAHIER DE CHARGES CI-DESSOUS:

« Dessiner une magnifique prairie d'été avec :

10 fleurs bleues avec 5 pétales chacune

5 fleurs bleues avec 6 pétales chacune

13 fleurs rouges avec 6 pétales chacune

2 vaches avec 3 tâches noires

1 vache avec 5 tâches noires

2 vaches avec 4 tâches noires

2 oiseaux en haut à gauche

3 oiseau au milieu

un soleil à droite avec 5 rayons »



PHASE 2 – EQUIPE 2

VOUS AVEZ 2 MINUTES POUR RÉALISER UN DESSIN SUIVANT LE CAHIER DE CHARGES CI-DESSOUS:

« Dessiner une magnifique prairie d'été avec des fleurs bleues et rouges dans de l'herbe verte, quelques vaches et oiseaux sous un soleil éclatant »



Objectif pédagogique

- Montrer l'importance de garder la vision globale plutôt que d'entrer dans les détails trop rapidement, cette dernière approche pouvant être dommageable à la pertinence/qualité du produit

Techniques du formateur

- Sortir la deuxième équipe de la salle avant de présenter à la première équipe le cahier de charges
- Laisser volontairement certains « flous » autour de la gestion des équipes (qui doit faire quoi)
- Laisser le cahier de charges visible pendant les 2 minutes de l'exercice

JEU « ARTISTS AND DESIGNERS »





Objectif

Le principe de base consiste à réunir une équipe composée de dessinateurs (artistes) et de clients (designers).

Les dessinateurs doivent reproduire un dessin sans l'avoir vu, par les simples explications de leur client.



- Dans une équipe il y a 2 concepteurs et plusieurs artistes
- Les concepteurs décrivent le tableau à dessiner
- Les artistes dessinent
- 3 itérations
 - 10 min par itération
 - 5 min présentation des tableaux et rétrospective



Itération 1

Par équipe :

- Les concepteurs écrivent en français la description du tableau.
- La description est soumise aux artistes
- Si les artistes ont des questions, ils les soumettent par écrit aux concepteurs
- La transmission des documents écrits se fait par un représentant désigné de chaque groupe
- L'échange oral n'est pas permis



Itération 2

Par équipe :

- Les règles de l'itération 1 sont appliqués
- La description écrite se fait par chaque élément du tableau
- Quand les concepteurs sont satisfaits d'un élément du dessin exécuté, ils passent au prochain.



Itération 3

Par équipe :

- Les concepteurs regardent le dessin le temps nécessaire pour le retenir
- Les concepteurs décrivent le dessin aux artistes qui doivent le dessiner
- Tout type d'échange est permis, sauf l'échange de rôles
- Après le début de l'échange, les concepteurs ne peuvent plus regarder le dessin



Objectif pédagogique

- Mettre en évidence de manière ludique l'importance des principes de bases de l'agilité (feedback continu, itération courte, communication face à face, etc.)

Techniques du formateur

- Présenter les règles de chaque itération au début de l'itération
- Laisser volontairement certains « flous » autour de la gestion (on précise le temps d'itération total, mais pas celui de spécification ou de production)

06

KANBAN



Définition



« KANBAN EST UNE [APPROCHE] POUR **DÉFINIR, GÉRER ET AMÉLIORER LES SERVICES** DANS L'ÉCONOMIE DU SAVOIR, TEL QUE LES SERVICES PROFESSIONNELS, L'INDUSTRIE DE LA CRÉATION ET LA CONCEPTION DE **PRODUITS PHYSIQUES ET LOGICIELS**. »



Source: Essential Kanban – Condensed Guide, 2015, p. 2,
<http://leankanban.com/guide/>


.Gérer le flux de travail



TERME JAPONAIS SIGNIFIANT « SIGNAL VISUEL » OU « CARTE ».


À LA FIN DES ANNÉES 40, LES EMPLOYÉS SUR LA CHAÎNE DE MONTAGE CHEZ TOYOTA UTILISAIENT CES CARTES POUR SIGNALER OÙ ILS ÉTAIENT RENDUS SUR LA CHAÎNE DE MONTAGE.

HISTORIQUE DE LA MÉTHODE KANBAN

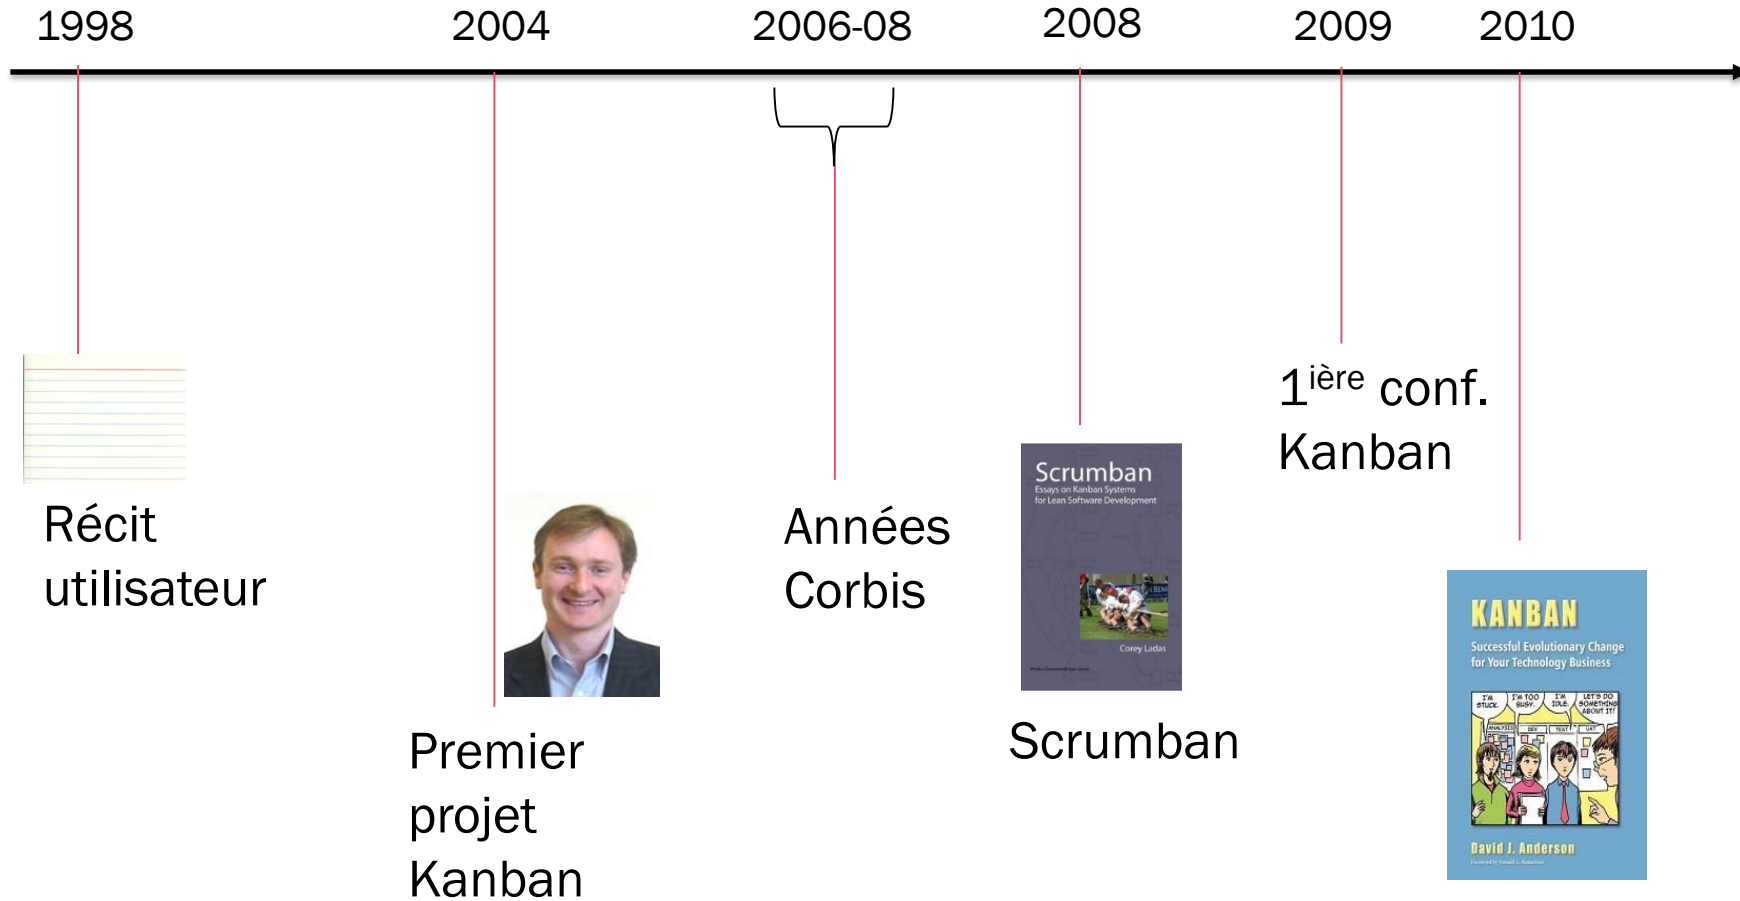


Source : 10 years of kanban – what have we learned?

<http://fr.slideshare.net/agilemanager/10-years-of-kanban-what-have-we-learned>

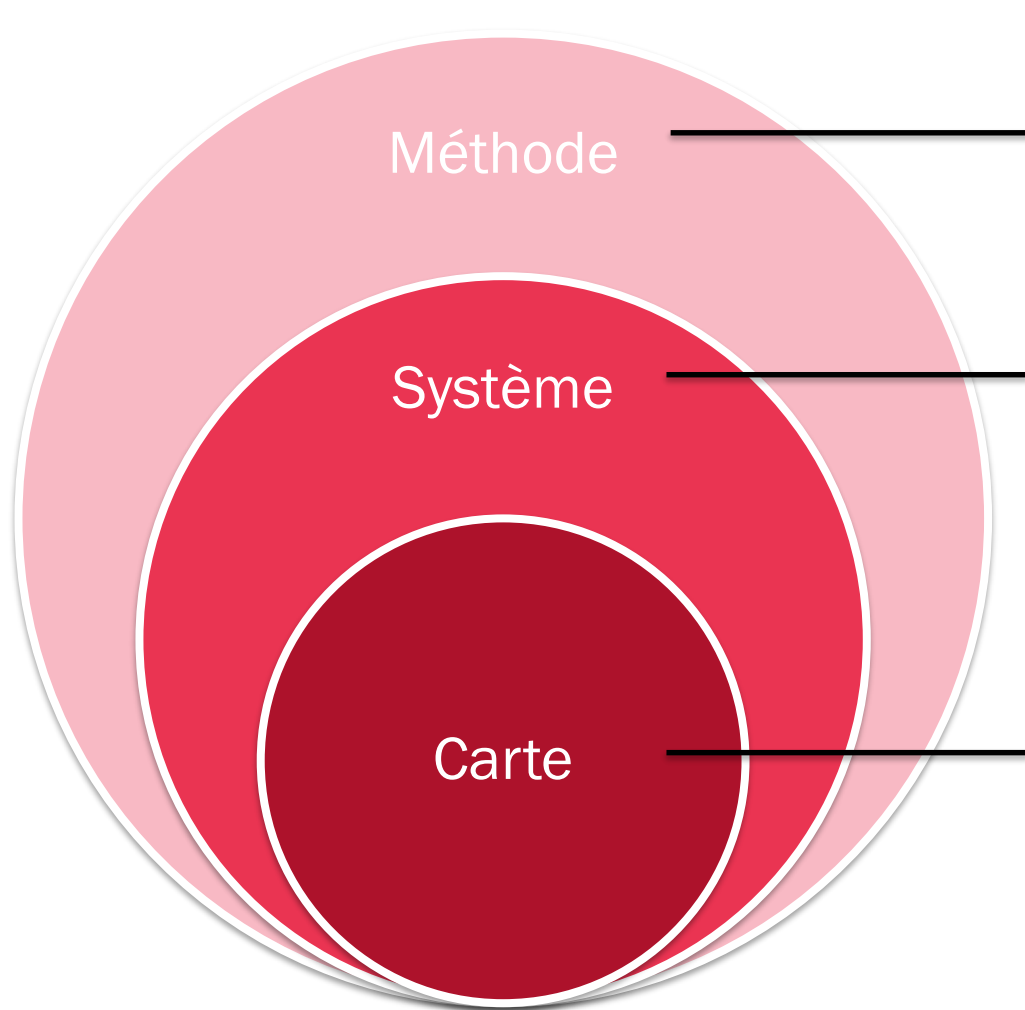

6 principes (3 + 3)

6 pratiques



Production Withdrawal Kanban	
Part # 11227T	
Storage Area	Location Flow Rack 15C
Description Left Hand Headrest Tube	
Quantity / Box 400	
Number of Cards: _____ of _____	
Date issued: February 1, 2012	

3 PRINCIPES (3 + 3)

GESTION DU CHANGEMENT

1. COMMENCER PAR CE QUE VOUS FAITES ACTUELLEMENT:

Comprendre les processus actuels.

Respecter les rôles, responsabilités et les titres.

2. ACCEPTER D'APPLIQUER DES CHANGEMENTS ÉVOLUTIFS ET AUGMENTÉS.

3. ENCOURAGER LES ACTES DE LEADERSHIP À TOUS LES NIVEAUX.

3 PRINCIPES (3 + 3)

PRESTATION DE SERVICE


1. **ÉVOLUER VOS POLITIQUES POUR AMÉLIORER LES RÉSULTATS CLIENTS ET D’AFFAIRES.**
2. **COMPRENDRE ET SE CONCENTRER SUR LES BESOINS ET ATTENTES DE VOS CLIENTS.**
3. **GÉRER LE TRAVAIL; LAISSER LES GENS S’AUTO-ORGANISER AUTOUR DE CE DERNIER.**

1. VISUALISER
2. LIMITER LE TRAVAIL EN COURS (WORK IN PROGRESS/WIP)
3. GÉRER LE FLUX
4. RENDRE LES NORMES DU PROCESSUS EXPLICITES
5. L'AMÉLIORATION CONTINUE
6. IMPLANTER DES BOUCLES DE RÉTROACTION

Limitier le travail en cours (WIP)

Flux continu

Normes explicites

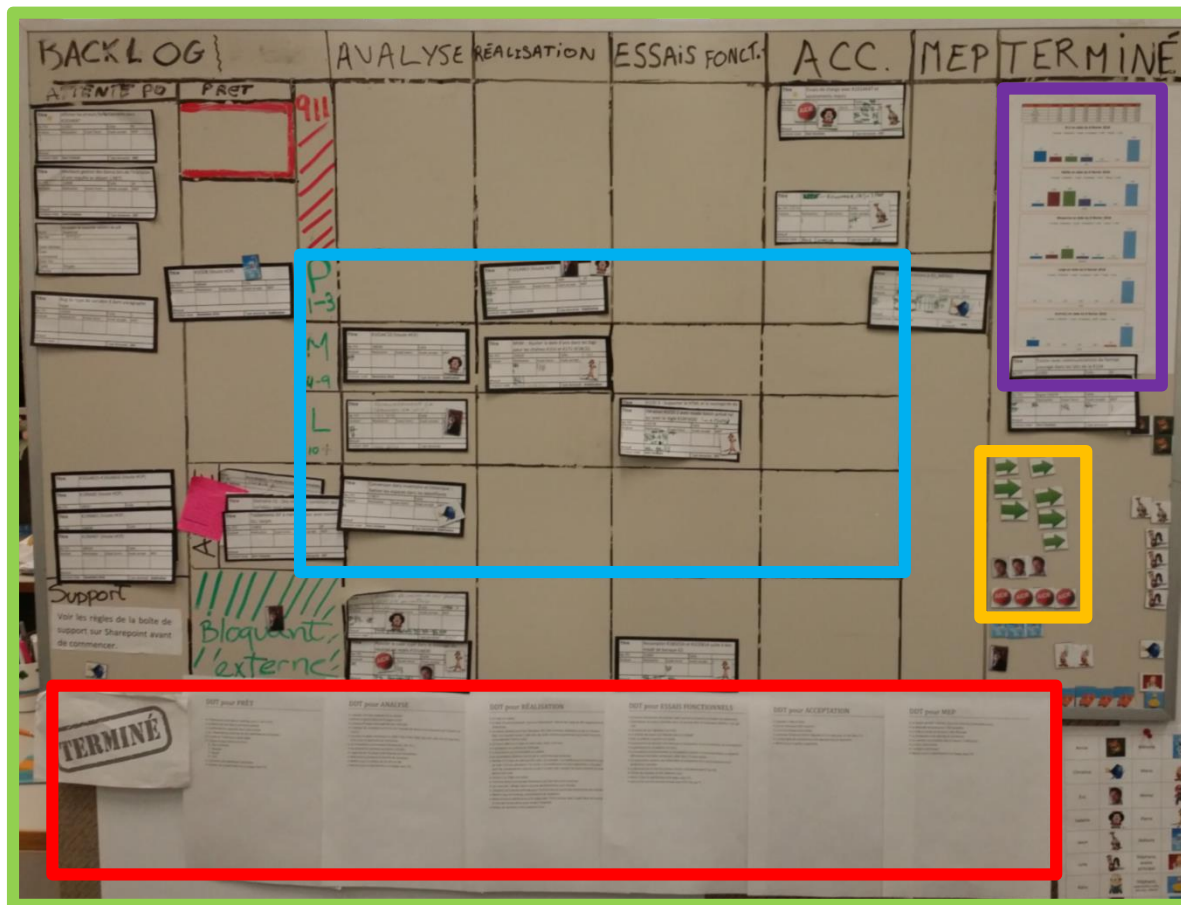

IDENTIFIER VOS ÉLÉMENTS DE TRAVAIL

DÉFINITION :

Unité individuelle de valeur d'affaires qui passe au travers de l'ensemble du tableau.

CARACTÉRISTIQUES:

Quelque chose qui requiert du travail

Du travail que vous voulez rendre visible

Du travail dont vous voulez suivre les indicateurs

EXEMPLES D'ÉLÉMENTS DE TRAVAIL

•INCIDENT

•RÉCIT UTILISATEUR

•ACCOMPAGNEMENT

•ANOMALIE

•DEMANDE DE SUPPORT

•AMÉLIORATION

•PILOTAGE

•PROJET

•SURVEILLANCE

•EXIGENCE

•CONVERSION

•RAPPORT

•FONCTIONNALITÉ


•DEMANDE DE SERVICE

Express

Cet élément a préséance sur tous les autres éléments du flux des travaux.

**Date fixe**


Cet élément doit être livré avant une date limite.

**Standard**


C'est une demande standard prise en charge s'il n'y a aucun Express ou Date fixe en avant de lui.

**Intangible**


C'est un élément de basse importance. Il est tiré dans le flux des travaux de manière ad hoc.



EXEMPLE VISUEL D'UN ÉLÉMENT DE TRAVAIL

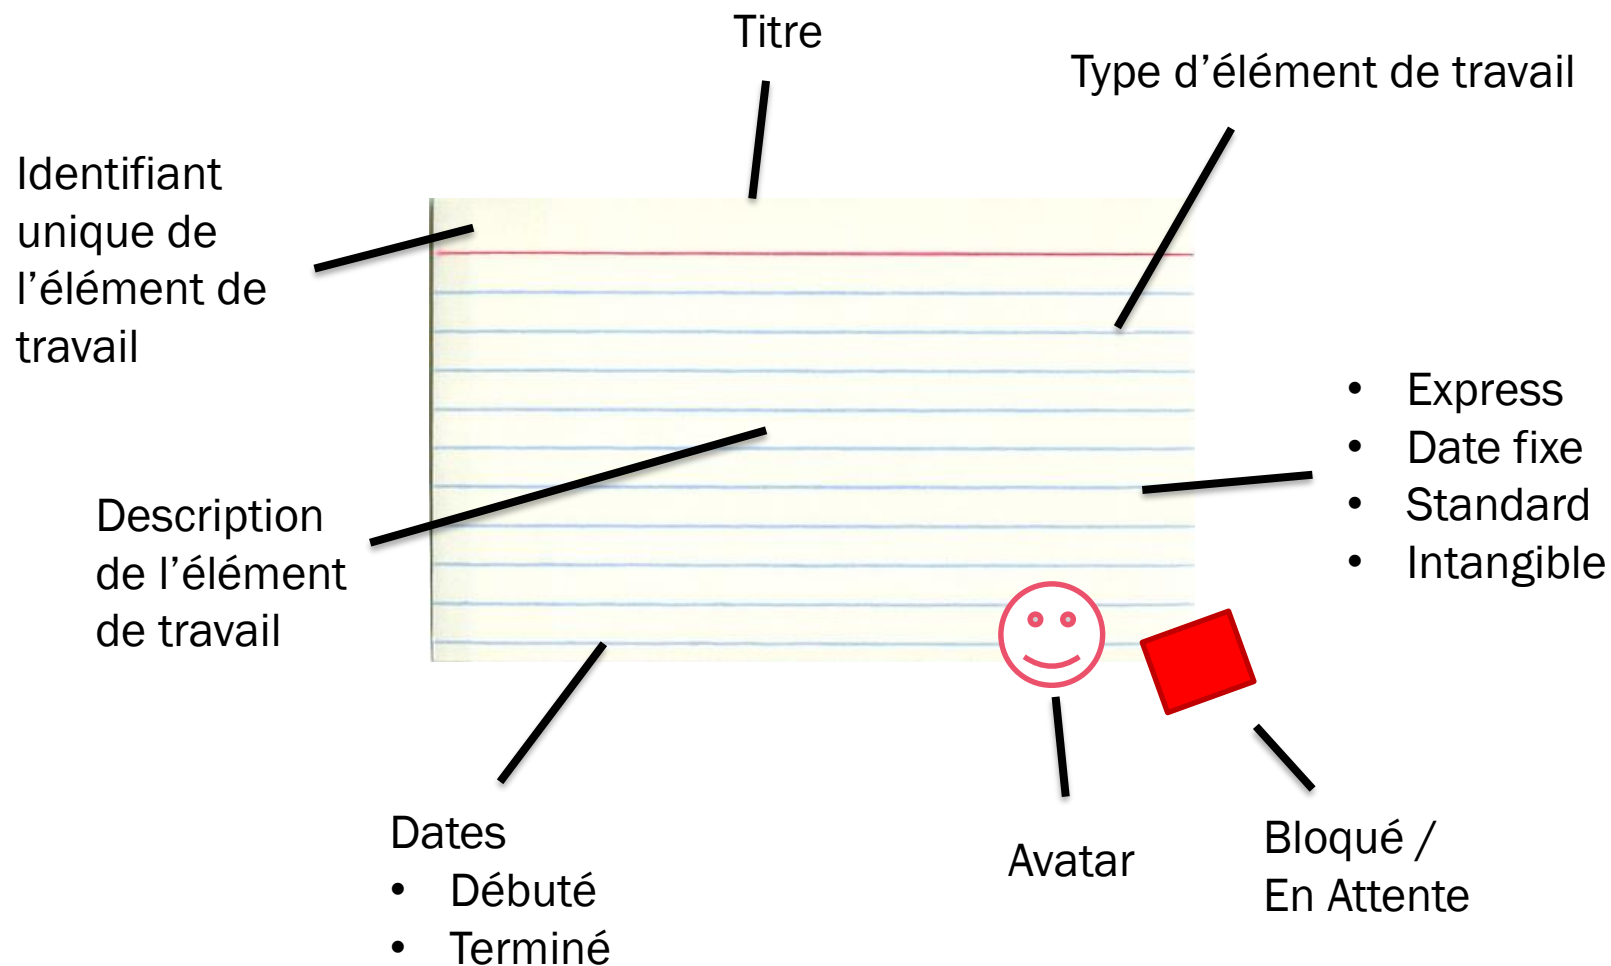

LIMITER LE TRAVAIL EN COURS (WIP)

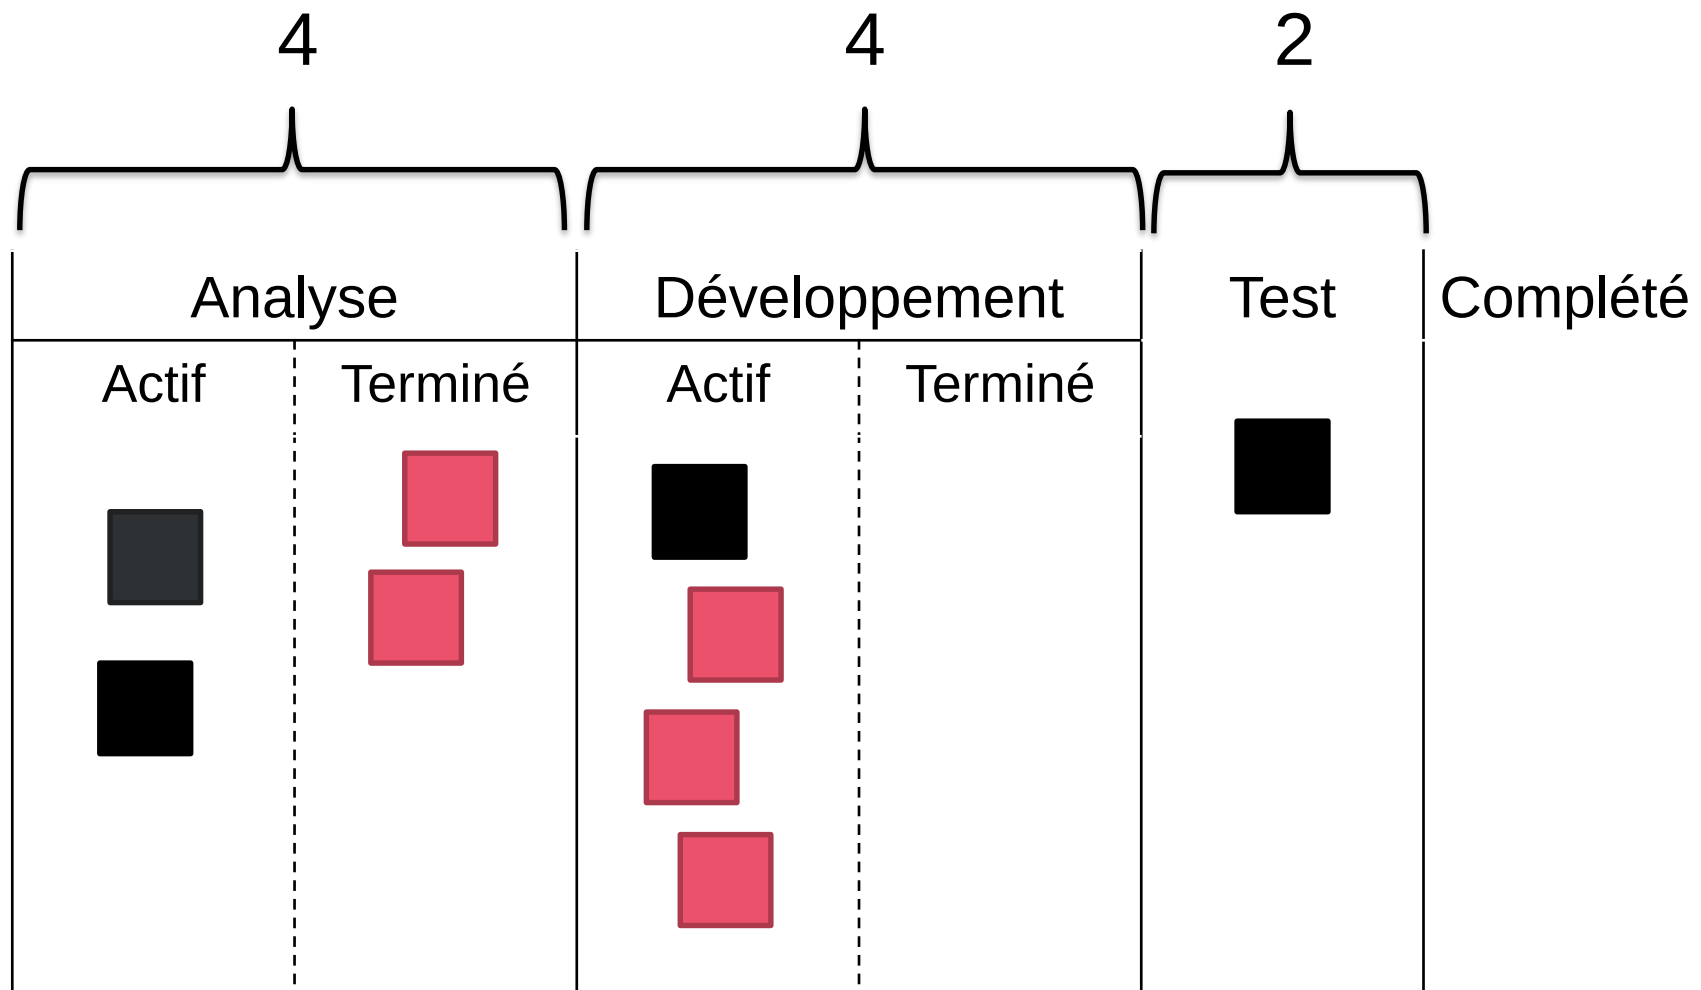

AJUSTER LES LIMITES DE TRAVAIL EN COURS (WIP)

1. LES LIMITES PEUVENT S'AJUSTER AU COURS DU TEMPS SELON LA CAPACITÉ DE L'ÉQUIPE:

Vacances/congé maladie

Prêt d'une personne dans une autre équipe

Spécialistes dans l'équipe

2. ATTENTION AUX COLONNES SANS LIMITE. ELLES PEUVENT CRÉER DES GOULOTS D'ÉTRANGLEMENT.

AJUSTER LES LIMITES DE TRAVAIL EN COURS (WIP)

3. LES LIMITES PEUVENT S'APPLIQUER SUR LES COLONNES ET LES LIGNES.

4. ATTENTION À L'USAGE DU CORRIDOR « EXPRESS »

Utiliser avec modération

Ralenti le reste du travail en cours


07

ET APRÈS ——— 07

SAFE : (SCALED AGILE FRAMEWORK®) : BASE DE CONNAISSANCES INTERACTIVE POUR IMPLÉMENTER LES PRATIQUES AGILES À L'ÉCHELLE DE L'ENTREPRISE.

LA "BIG PICTURE" DÉCRITE AU SLIDE SUIVANT MONTRE LES RÔLES, ÉQUIPES, ACTIVITÉS & ARTEFACTS NÉCESSAIRES POUR ÊTRE AGILE QUE CE SOIT AU NIVEAU D'UNE ÉQUIPE, D'UN PROGRAMME OU D'UNE ENTREPRISE

SAFe® 4.0 for Lean Software and Systems Engineering

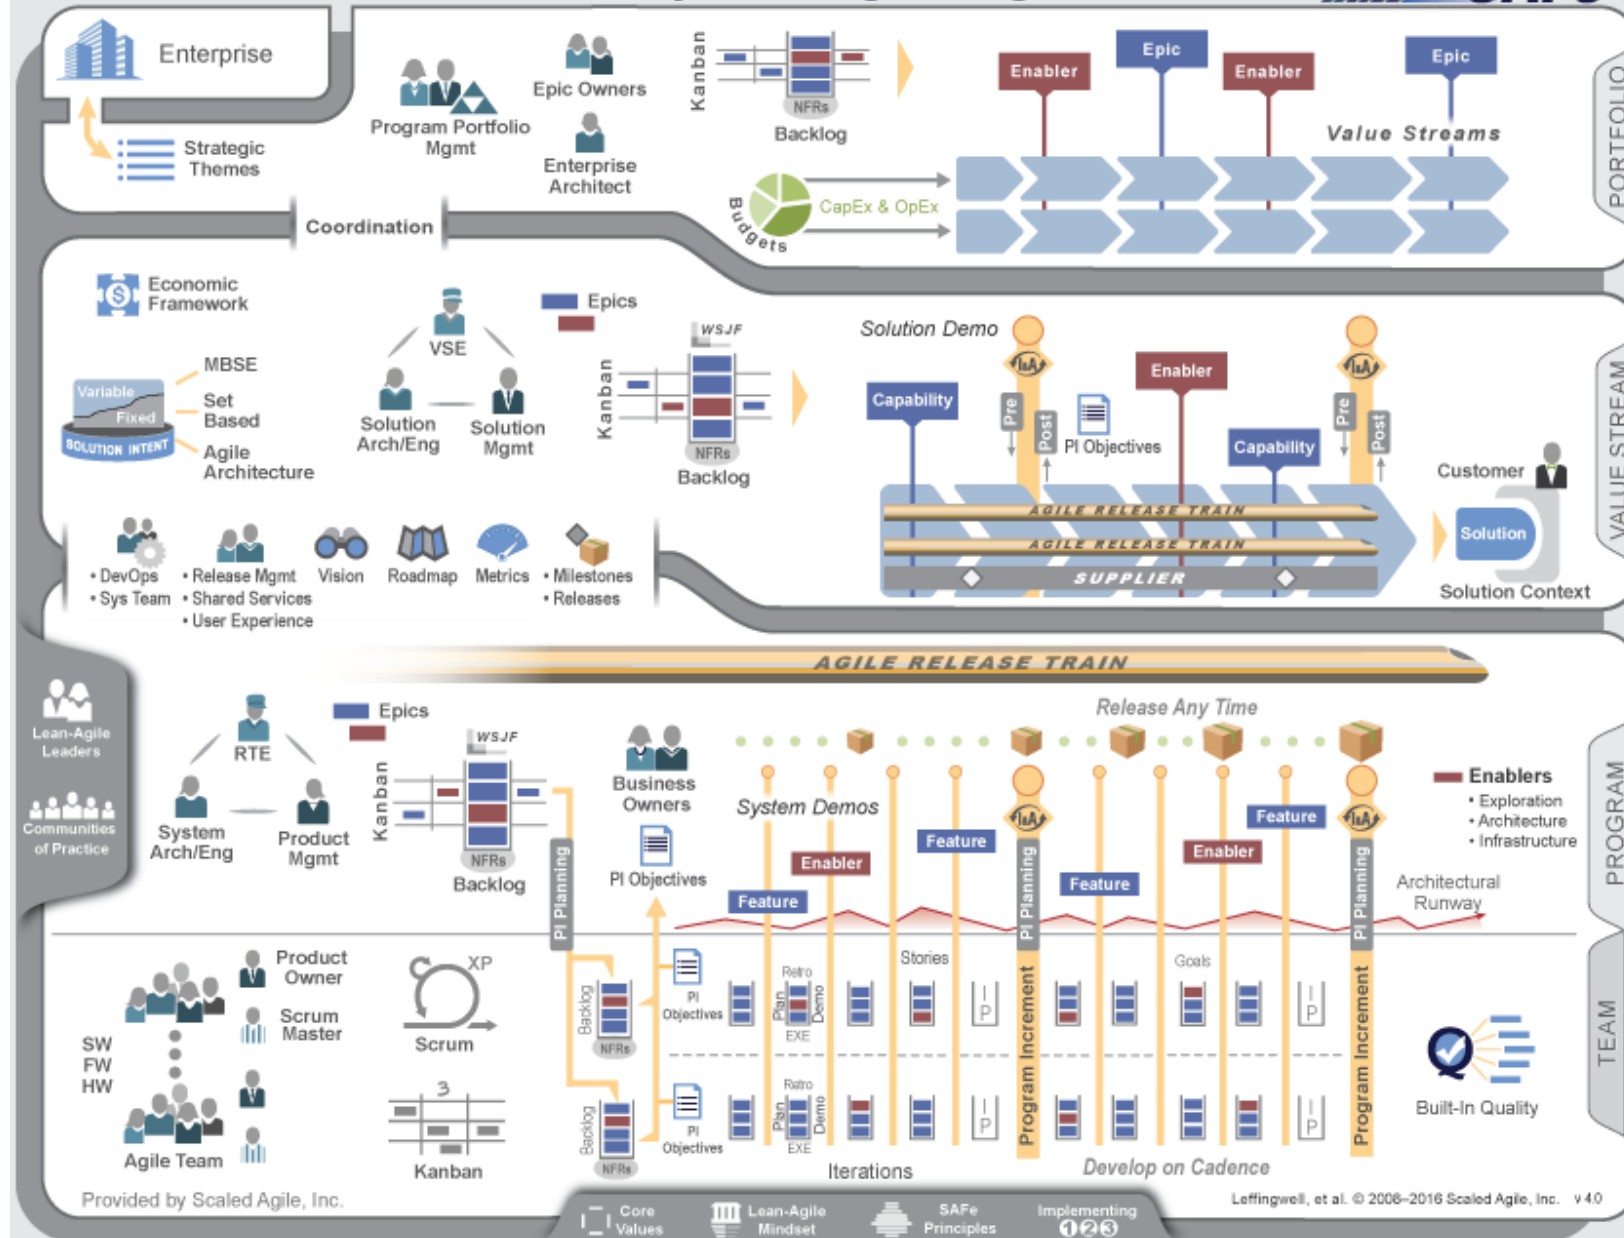

Provided by Scaled Agile, Inc.

Leffingwell, et al. © 2006–2016 Scaled Agile, Inc. v 4.0

<http://scaledagileframework.com/>

Responsabilités Principales :

Analyse d'exigences et gestion de Programme
Gestion de contenu d'une release
Intégration et activités de Déploiement

Roles:

Product Manager / Business Analyst, Solution Manager, Release Manager, Quality Manager, Service Manager, Process Owner, Architect



Description : l'équipe "**Product Management**" est responsable de définir et de prioriser la **Backlog Programme**, et de travailler avec des Product Owners pour optimiser la livraison de **Features** aux clients en restant en phase avec les objectifs techniques et économiques de l'entreprise. L'équipe « **Release Management** » est responsable de la planification, de la gestion et de la gouvernance de releases synchronisées qui **intègrent** les résultats des travaux de plusieurs équipes Agiles. Cette équipe gère aussi typiquement le **déploiement** d'une release..


Feature – exigence qui accomplit un ou plusieurs besoins d'un stakeholder. La mise en œuvre d'un feature doit s'adapter dans le cycle de release convenu, typiquement 2-3 mois

Responsabilités Principales :

Définir, construire, tester, intégrer, déployer, maintenant et soutenir les composant/service IT

Roles:


Product Owner, Scrum/Agile Master, Developer, Tester, Architect

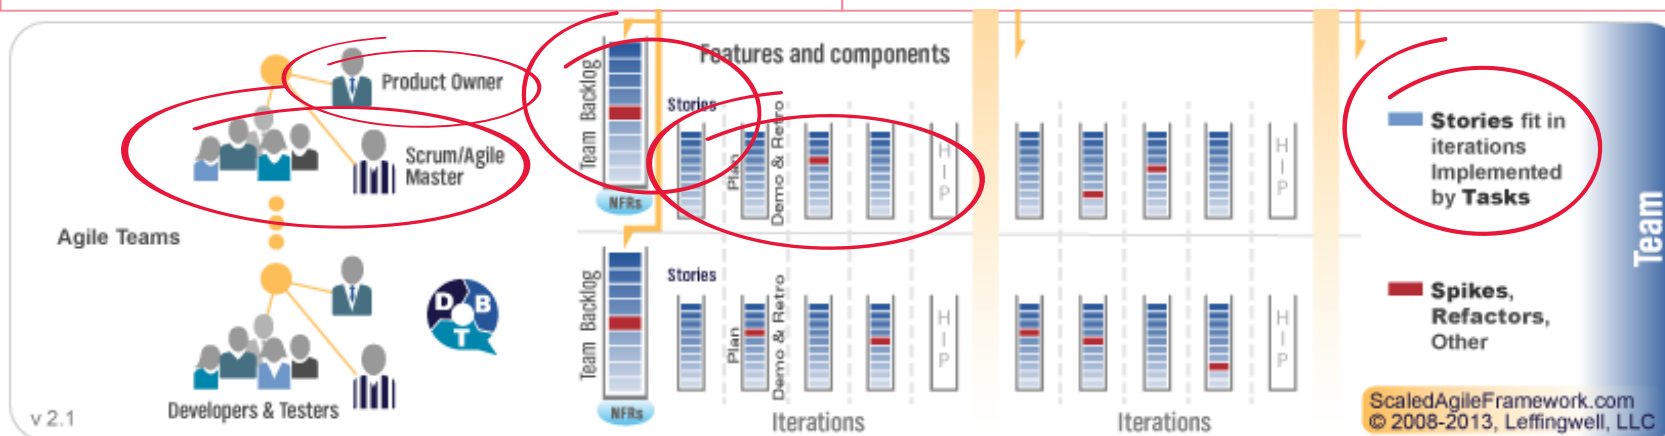

Description: Chaque Équipe Agile est responsable de Définir/Construire/Tester les **user stories** de sa **backlog** dans une série **d'itérations** de longueur fixe (sprints). Par la suite, un certain nombre d'équipes Agiles (typiquement 5-10) coopèrent en intégrant leur code pour construire les features et les composants d'applications et solutions de niveau Programme, ayant une valeur métier plus large et plus élevée. Le déploiement de la solution totale peut être la responsabilité d'une équipe dédiée ou une activité en soi, de niveau « Programme ».

User Story – exigence à valeur ajoutée pour un utilisateur et centrée sur l'utilisateur, pouvant être implémentée durant une **itération**, typiquement de longueur 2-4 semaines.

ALIGNEMENT DU PORTFOLIO PROGRAM À L'ÉQUIPE

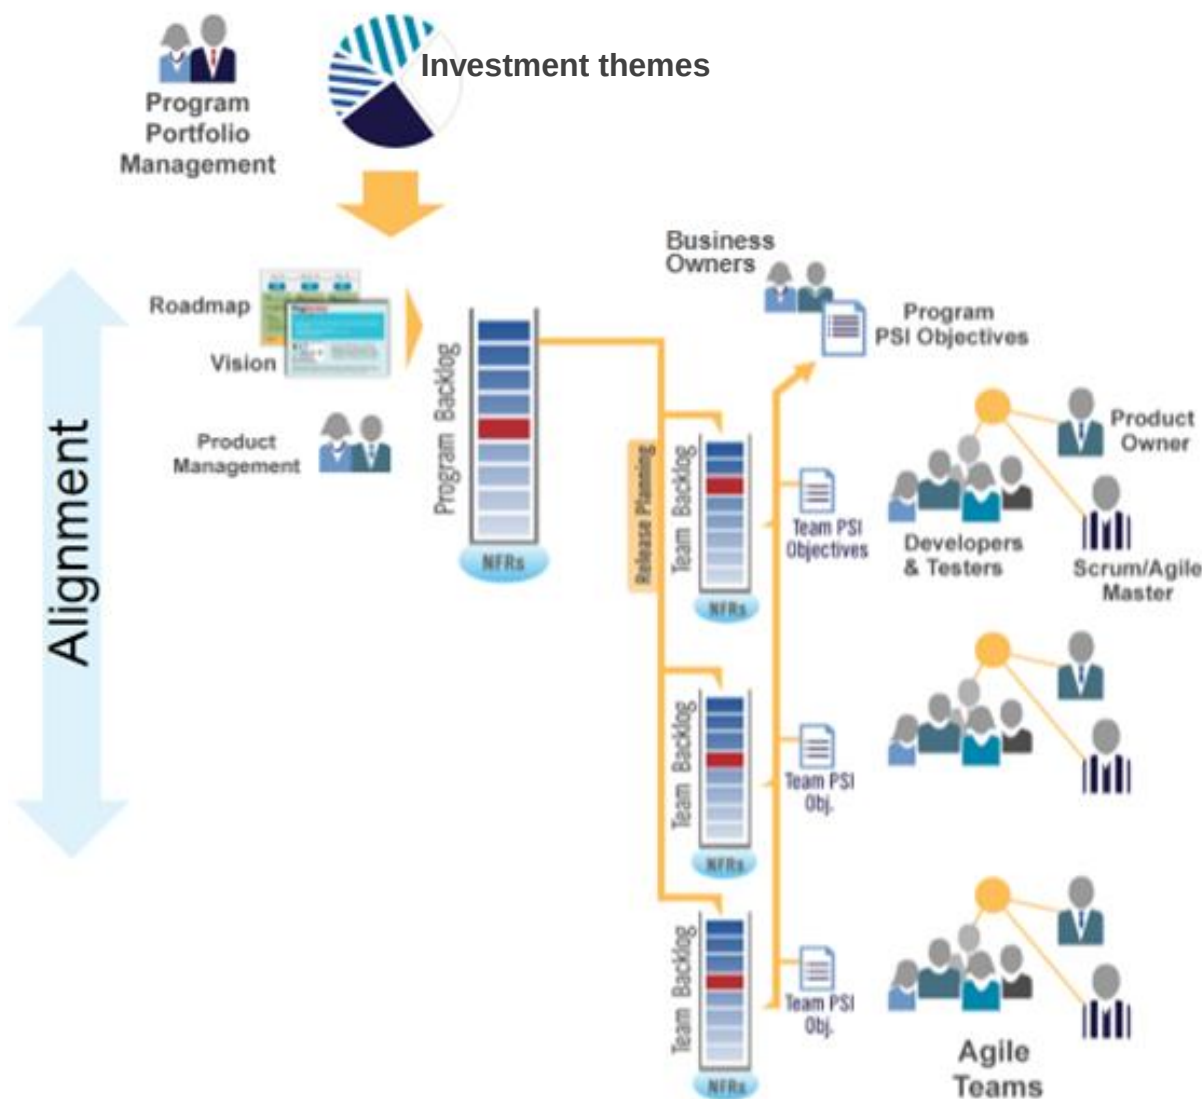


PLANIFICATION EN FACE À FACE

EQUIPE ALIGNÉE AVEC LE PROGRAMME ET LES OBJECTIFS DES BUSINESS OWNERS

COORDINATION ENTRE LES DIFFÉRENTES ÉQUIPES ET ENTRE LES DIFFÉRENTS PROGRAMMES

TRANSPARENCE : FAVORISER L'ALIGNEMENT ET LA CONFIANCE

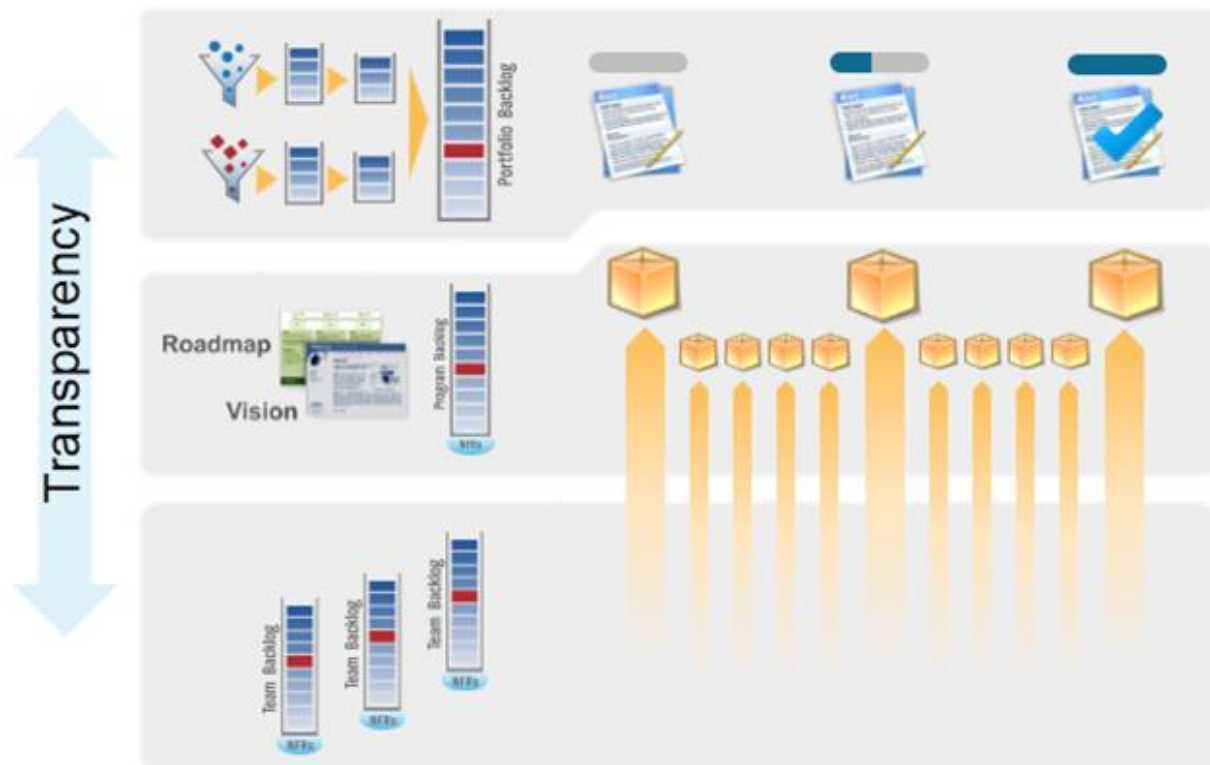


TOUTES LES BACKLOGS ET PROGRESSIONS SONT VISIBLES À TOUS LES STAKEHOLDERS

LA MESURE DE L'AVANCEMENT SUR LES OBJECTIFS EST BASÉE SUR LE CODE TESTÉ ET ÉVALUÉ

CHACUN COMPREND LA BACKLOG, LA VÉLOCITÉ, LE WIP

BÉNÉFICES DE LA MISE EN ŒUVRE DE L'AGILE ENTERPRISE

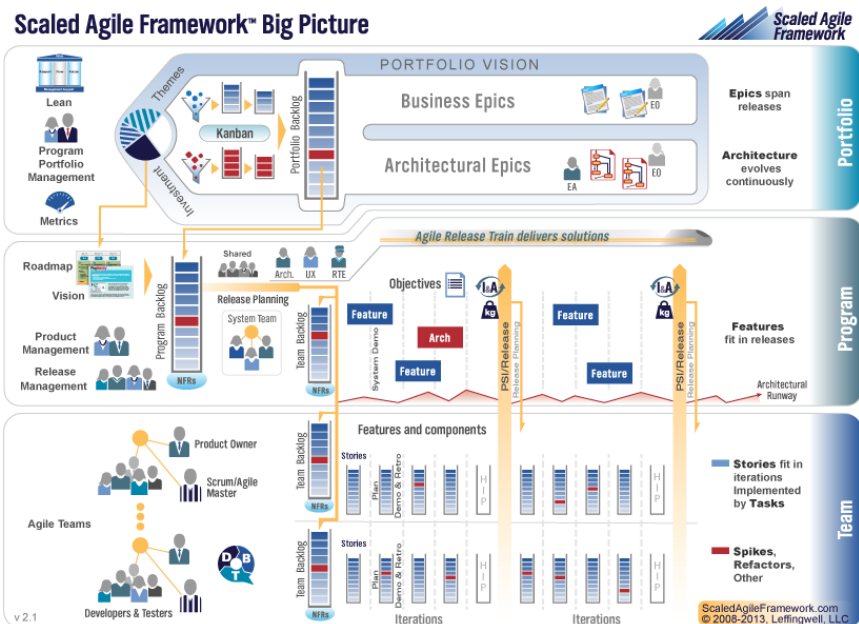

VITESSE, RÉSULTATS ET VISIBILITÉ!

- FLUX DE VALEUR CONTINU.
- PRODUCTIVITÉ & QUALITÉ ACCRUES, ROI ATTEINT PLUS VITE
- MÉTHODES AGILES ÉTENDUES AU NIVEAU PROGRAMME
- GESTION DES EXIGENCES PILOTÉE PAR LA DIMENSION MÉTIER.
- VISIBILITÉ À TOUT MOMENT
- MONTÉE EN PUISSANCE DES ÉQUIPES
- CULTURE D'APPRENTISSAGE CONTINU

Manifeste Agile : <http://agilemanifesto.org/iso/fr/manifesto.html>

Guide Scrum (EN) : <http://www.scrumguides.org>

SAFe : <http://www.scaledagileframework.com>

Organisation de la réunion

ROTI POUR CETTE REUNION !

Valeur

Feedback

Lean Thinking !

Transparence

Courage



"**Excellent**. Voilà une super réunion dont je vais bénéficier. Ça valait bien plus que le temps qu'on y a passé"



"**Bonne**. Voilà une réunion au dessus de la moyenne. J'ai gagné plus que le temps que j'y ai passé "



"**Juste Moyenne**. Je n'ai pas perdu mon temps, sans plus"



"**Utile** mais ça ne valait pas à 100% le temps que j'y ai passé. J'ai donc perdu du temps "



"**Inutile**. Je n'ai rien gagné, rien appris. J'ai vraiment perdu 1 heure ! "

Jean Claude Grosjean - www.qualitystreet.fr



MERCI

www.cgi.fr/fr-fr/conseil

THEAUD JULIEN

Coach AGILE

Julien.theaud@cgi.com

+33-681771482

[linkedin.com/theaudjulien](https://www.linkedin.com/company/theaudjulien)



@luteo

